

**Dodatek č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/287/2018/OVR**

"Rekonstrukce atletického stadionu v Klášterci nad Ohří"

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany :

1. Objednatel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupené:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Zástupce ve věcech organizačních:

Město Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51

00261939

CZ00261939

Ing. Štefan Drozd, starosta města

Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
tel.:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
tel.:

2. Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupená:

Zápis v OR:

Rekonstrukce atletického stadionu Klášterec, sdružení

Vedoucí společník: STAVMAX Group s.r.o.

Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

06080090

CZ06080090

Jiřím Bezděkem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39586

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Tel., e-mail:

ČSOB a.s., pobočka Kadaň

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo ze dne 12.07.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.10.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 11.12.2018 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku je prodloužení doby provedení díla z důvodu trvání nevhodných klimatických podmínek pro realizaci finálních tartanových povrchů (déšť a nízké teploty, které během instalace povrchu nesmí klesnout pod 10°C a během vyžrávání pod 5°C po dobu 24-hodin), které jsou v rozporu s technologickými předpisy pro pokládku. V souladu s ustanovením čl. 3.6 smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení doby provedení části díla - pokládky tartanových povrchů o 15 dní ode dne skončení nevhodných klimatických podmínek, specifických pro tuto část díla.

II.

- 2.1. Článek 3 Doba plnění bod 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Článek 3

Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a předat ve lhůtě nejdéle do 14. 06. 2019 včetně kolaudace (limitní termín).“
- 2.2. Příloha č. 1 Podrobný harmonogram výstavby se ruší a nahrazují novým zněním, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.


III.

- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 12.7.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.10.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 11.12.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: Příloha č. 1 Podrobný harmonogram výstavby

V Klášterci nad Ohří dne:

V Klášterci nad Ohří dne:

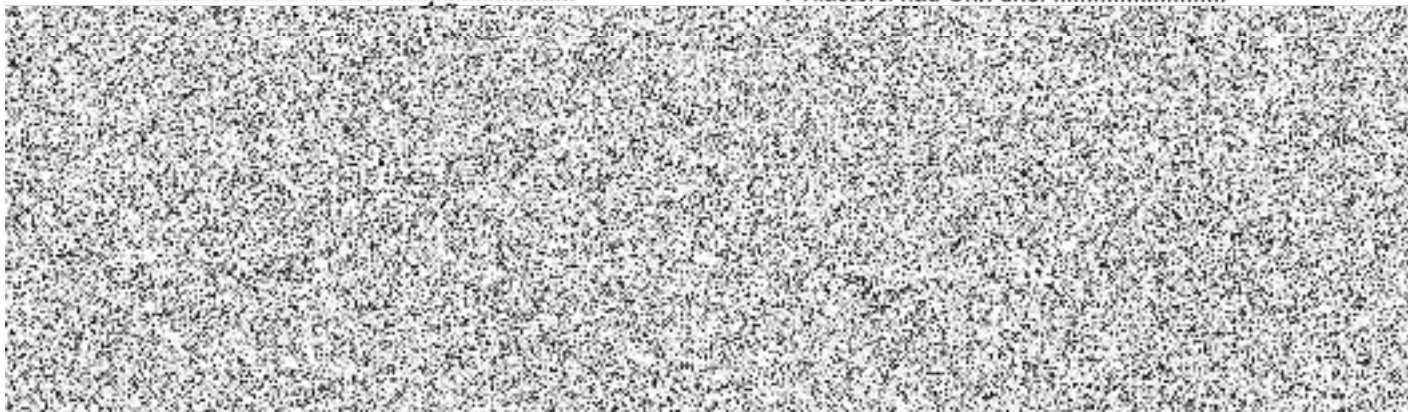

Harmonogram prací - aktualizace 03

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu v Klášterci nad Ohří

[illegible]

[illegible]

Postup realizace zakázky je definován výše zpracovaným harmonogramem prací.

Milnky:

1. Dokončení bursních prací - ukončených 11 týdnů od zahájení prací
2. Dokončení drenáží a povrchového odvodnění bez fin. terénních úprav - ukončených 14 týdnů od zahájení prací
3. Dokončení peckladních konstrukcí sportovních povrchů - ukončení 22 týdnů od zahájení prací
4. Kompletní dokončení sportovních povrchů - ukončení 35 týdnů od zahájení prací
5. Dokončení terénních úprav - ukončení 26 týdnů od zahájení prací

Harmonogram kontrol, zkoušek a revizí:

I. Zkoušky hutnění:

1. SO 02 Zpevněné plochy - Zkouška hutnění zemní pláně před pokládkou podkladních konstrukčních vrstev - 10. týden
2. SO 02 Zpevněné plochy - Zkouška hutnění podkladních konstrukčních vrstev před pokládkou finálních povrchů - 22. týden
3. SO 03 Oplocení - Zkouška hutnění základové spáry - 18. týden

II. Zkoušky těsnosti potrubí:

1. SO 05 Drenáže a povrchové odvodnění - Tlakové zkoušky potrubí - 10. týden

III. Zkoušky funkčnosti el. zařízení:

1. SO 04 Veřejné osvětlení - Zkouška funkčnosti el. zařízení vč. revize - 22. týden

Jiří Bezděk

Jifi Bezdok
