

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.: SD/167/2021/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.



dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta



Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR;

Jana Kühnerová – referent OVR;

Petr Vaněk – referent OVR;



1.2. Zhotovitel

Adam Vavroušek

Podnikající na základě povolení živnostenského úřadu v Kadani ze dne 12.12.2006, č. j. ŽÚ-4867/06/R-Kr, ev.č. 350304-100574

se sídlem: Útočiště 54, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 69404828

DIČ: CZ69404828

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.



dále jen „zhotovitel“

II.

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 03.05.2021 z důvodu zjištění, že při provádění stavebních prací po jednotlivých částech (nikoli komplexně – z časových a finančních důvodů) je nutné zajistit bezpečný provoz, logistiku a ucelenost realizovaných částí v návaznosti na jejich pokračování v dalších letech. Z těchto důvodů byly provedeny vícepráce nad rozsah výše specifikované smlouvy o dílo, specifikované v Příloze č. 1 - Změnový list stavby tohoto Dodatku č. 1. Tedy dochází rovněž k navýšení ceny díla o 327.675,05 Kč bez DPH (kdy výše DPH činí 68.811,76 Kč, celkem tedy navýšení o 396.486,81 Kč vč. DPH)
- 2.2. Čl. IV. Cena bod 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :
Cena celkem bez 21% DPH.....2.871.279,11 Kč
DPH 21%602.968,61 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH..... 3.474.247,72 Kč
Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění“.

III.


- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. I) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 03.05.2021.

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Příloha č. 2: Soupis provedených prací (Rozpočet)

V Klášterci nad Ohří dne **13 -08- 2021**
Za objednatele:

V Klášterci nad Ohří dne
Zhotovitel: 13 -08- 2021

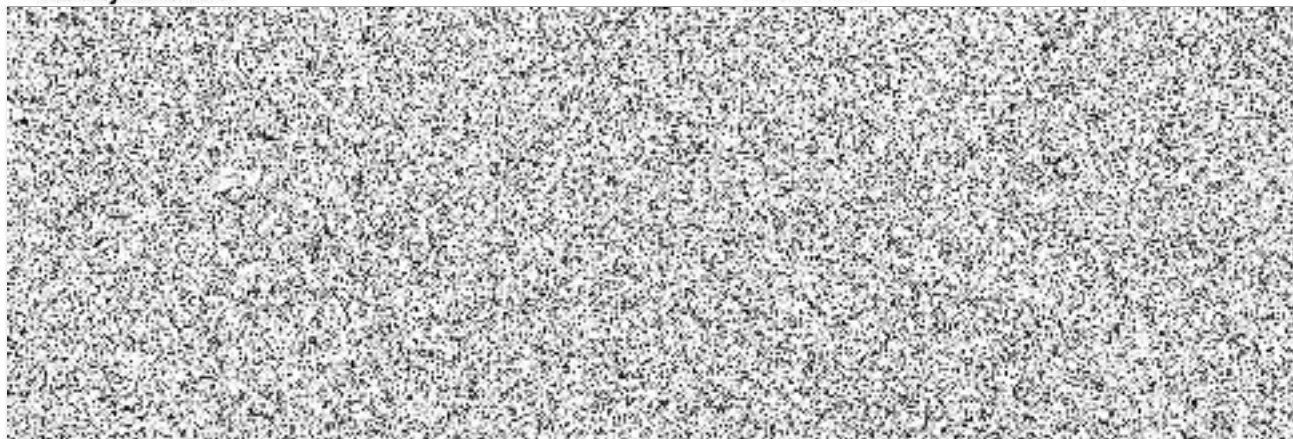

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změny č: 1

Datum změny: 10.8. 2021

Název veřejné zakázky:

„Školská zařízení 2021 – stavební práce“

Zhotovitel: Adam Vavroušek, Útočiště 54, 431 51 Klášterec nad Ohří

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny: Změna provedení: Stavební úpravy	Druh financování: Vlastní	Druh prací: Vícepráce	Stavební oddíly: Elektromontážní práce Stavební práce
--	-------------------------------------	---------------------------------	--

Specifikace změny:

I. ZŠ Petléřská

1. Úprava elektroinstalace a nové vyzbrojení a zesílení kapacity el. rozvaděče

Vícepráce v hodnotě: +56.070,55 Kč bez DPH

2. Vyštukování místnosti šaten

Vícepráce v hodnotě: +43.797,00 Kč bez DPH

3. Výměna dlažby na chodbě - bourání podkladních betonů

Méněpráce v hodnotě: - 43.795,50 Kč bez DPH

II. ZŠ Školní

1. Kompletní výměna obkladů a dlažeb v koupelnách tělocvičny

Vícepráce v hodnotě: +165.569,00 Kč bez DPH

2. Výměna ležatých rozvodů ÚT v objektu tělocvičny

Vícepráce v hodnotě: +108.316,50 Kč bez DPH

3. Výměna vodovodních baterií v koupelnách objektu tělocvičny

Méněpráce v hodnotě: -108.316,44 Kč bez DPH

4. Výměna vodovodní a kanalizační stoupačky (svislých rozvodů) – pavilon U12

Vícepráce v hodnotě: +106.033,94 Kč bez DPH

Popis změn:

I. ZŠ Petléřská

1. Úprava elektroinstalace a nové vyzbrojení a zesílení kapacity el. rozvaděče.

V nově vybudované prádelně, budou nově umístěny el. zařízení – aut. pračka a sušička prádla. Obě tato el. zařízení vyžadují samostatné jištění v el. rozvaděči. Stávající el. rozvaděč a rozvody elektroinstalace toto neumožňují, musí se rozvést nové rozvody elektroinstalace a vyzbrojení el. rozvaděče.

2. Vyštukování místnosti šaten

Stávající místnost šaten, měla být podle rozpočtu pouze nově vymalována. Po provedení dispozičních úprav v této místnosti (vybudování prádelny), bylo dohodnuto, že budou oškrábány staré malby, stěny stávajících prostor šaten nově vyštukovány, aby došlo ke sjednocení stávajících a nově vybudovaných stěn.

3. Výměna dlažby na chodbě - bourání podkladních betonů

V rámci výměny dlažby na chodbě bylo v rozpočtu i bourání podkladních betonů. Po odbourání stávající dlažby bylo zjištěno, že podkladní betony nejsou porušeny v celém rozsahu a mohou být lokálně zachovány.

II. ZŠ Školní

1. Kompletní výměna obkladů a dlažeb v koupelnách tělocvičny

Po provedení výměny stávajících rozvodů vody a kanalizace za nové, byl rozsah lokálně vybouraných míst jak v podlahách, tak i na stěnách rozsáhlý. Stávající typ dlažby a obkladu nebylo možné již dokoupit (asi 40 let staré materiály). Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že dlažby z podlah a obklady ze stěn budou odstraněny v celém rozsahu a kompletně nahrazeny novými a tím budou prostory zcela rekonstruovány.

2. Výměna ležatých rozvodů ÚT v objektu tělocvičny

Při výměně ležatých rozvodů vody v tělocvičně bylo zjištěno, že tyto se nachází v montážním kanálu, který je umístěn v podlaze na chodbě. Současně s rozvody vody se v montážním kanálu pod rozvody vody nacházeli dožilé, ležaté rozvody ústředního vytápění, které by zůstaly po osazení nových rozvodů vody nepřístupné. Při vzniklé havárii na rozvodech ÚT by musely být z důvodu přístupnosti opětovně demontovány i nově položené rozvody vody. Proto bylo dohodnuto, že rozvody ústředního vytápění budou také v tomto úseku vyměněny za nové.

3. Výměna vodovodních baterií v koupelnách objektu tělocvičny

V rozpočtu byly navrženy nové baterie sprchové podomítkové samouzavírací s hlavou sprchovou + podomítkové těleso do koupelen v tělocvičně. Tyto navržené vodovodní baterie nejsou vhodné do těchto prostor v rámci častého a nešetřného používání, proto byly nahrazeny vodovodními bateriemi vhodnými do tohoto provozu.

4. Výměna vodovodní a kanalizační stoupačky (svislých rozvodů) – pavilon U12

Nad rámec stavebních prací z uzavřené SoD byla provedena kompletní výměna svislých rozvodů kanalizace a vody (jedné stoupačky) v pavilonu U12, které byly v havarijním stavu a jejich oprava byla plánována na příští rok.

Celková bilance změn:

Vícepráce v hodnotě:	+ 479.786,99 Kč bez DPH	+ 580.542,26 Kč vč. DPH
Méněpráce v hodnotě:	- 152.111,94 Kč bez DPH	- 184.055,45 Kč vč. DPH


Změny jsou podřazeny pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla

Posouzení změny - technický dozor: Se změnami souhlasím : Petr Vaněk		Datum: 10.08.2021	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne):		ANO: rozpočet
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do:

Dopady:	Do ceny:	Snížení ceny o: (Kč vč. DPH)	-184.055,45 Kč	Balance: +396.486,81 Kč vč. DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč vč. DPH)	+580.542,26 Kč	
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně			2.871.279,11 Kč bez DPH 602.968,61 Kč 21% DPH 3.474.247,72 Kč vč. DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:	Adam Vavroušek	Datum: 10.08. 2021
Zástupce objednatele - jméno:	Vlastimil Dokoupil	Datum: 10.08. 2021
	Petr Vaněk	

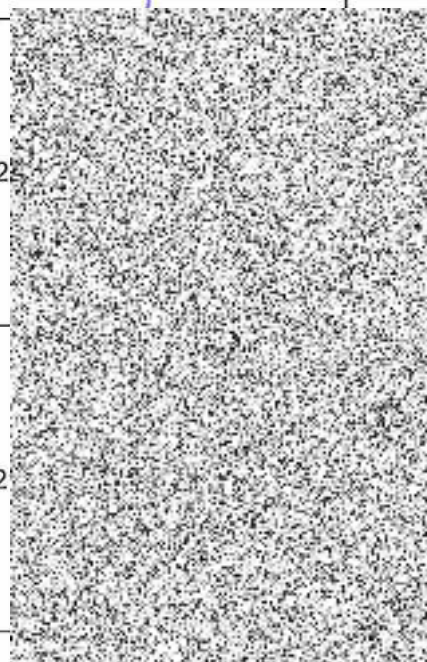

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Školská zařízení 2021 - stavební práce - vícepráce rozvody ÚT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	327 675,05
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	327 675,05
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	327 675,05	68 811,76
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	396 486,81
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Školská zařízení 2021 - stavební práce - vícepráce rozvody ÚT

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	327 675,05	396 486,82
	ZŠ Školní vícepráce	108 316,50	131 062,97
	ZŠ Školní méněpráce	-108 316,44	-131 062,89
	ZŠ Petterská vícepráce	43 797,00	52 994,37
	ZŠ Petterská méněpráce	-43 795,50	-52 992,56
	ZŠ Školní pavilon U 12 Vícepráce	54 788,50	66 294,09
	ZŠ Školní pavilon U 12 vícepráce rozvody	51 245,44	62 006,98
	ZŠ Školní - vícepráce obklady a dlažby	165 569,00	200 338,49
	ZŠ Petterská - vícepráce elektro	56 070,55	67 845,37
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		327 675,05	396 486,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školská zařízení 2021 - stavební práce - vícepráce rozvody ÚT

Objekt:

20201113-14 - Tělocvična

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	108 316,50
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	108 316,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 316,50	21,00%	22 746,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	131 062,97
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školská zařízení 2021 - stavební práce - vícepráce rozvody ÚT

Objekt:

20201113-14 - Tělocvična

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	108 316,50
------------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	6 300,00
---------------------------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 300,00
---	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	94 116,50
---------------------------	-----------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	94 116,50
--	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 900,00
--------------------------------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
-----------------------------------	----------

VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
-----------------------	----------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Zařízení staveniště	0,00
---------------------	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Územní vlivy	0,00
--------------	------

Provozní vlivy	0,00
----------------	------

Jiné VRN	0,00
----------	------

Kompletační činnost	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	108 316,50
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školská zařízení 2021 - stavební práce - vícepráce rozvody ÚT

Objekt:

20201113-14 - Tělocvična

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

108 316,50

D HSV Práce a dodávky HSV 6 300,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 300,00

8	K	953941711	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objímek nebo držáků, ve zdivu cihelném	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
9	M	28654692	objímka kovová s vrutem D 20-25mm	kus	30,000	120,00	3 600,00
10	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,000	1 500,00	1 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 94 116,50

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 94 116,50

23	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	6,000	130,00	780,00
24	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	2,000	150,00	300,00
25	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	60,000	250,00	15 000,00
28	K	722170948	Připojení vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 2	kus	4,000	550,00	2 200,00
32	K	722174003.BAS	Potrubí vodovodní plastové PPR s čed. vlákný svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	6,000	405,00	2 430,00
33	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	2,000	410,00	820,00
38	K	722174006.BAS	Potrubí vodovodní plastové PPR s čed. vlákný svar polyfúze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	60,000	755,00	45 300,00
39	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	2,000	790,00	1 580,00
45	K	722181224	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm	m	60,000	45,00	2 700,00
46	K	722181812	Demontáž izolačních pásů z trub do Ø 50(skelná vata)	m	60,000	95,00	5 700,00
47	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	8,000	550,00	4 400,00

vv

upevněná výpust DN 15

49	K	722232061	Armatury se dvěma závitů (vypoštěcí-napouštěcí) G 1/2	kus	4,000	250,00	1 000,00
52	K	722232065	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4	kus	4,000	890,00	3 560,00
56	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	60,000	50,00	3 000,00
57	K	722290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,630	550,00	346,50
58	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	10,000	500,00	5 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	10,000	415,00	4 150,00
107	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	0,000	0,00	0,00
108	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	5,000	550,00	2 750,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

109	K	071103000	Provoz investora	sou	1,000	1 000,00	1 000,00
-----	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - odpočet baterií - méněpráce

Objekt:

20201113-14 - Tělocvična

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-108 316,44

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-108 316,44

DPH základní
snížená

Základ daně

-108 316,44

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-22 746,45

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-131 062,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - odpočet baterií - méněpráce

Objekt:

20201113-14 - Tělocvična

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-108 316,44
PSV - Práce a dodávky PSV	-108 316,44
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	-108 316,44
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-108 316,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - odpočet baterií - méněpráce

Objekt:

20201113-14 - Tělocvična

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-108 316,44

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

-108 316,44

69	M	55145541R	baterie sprchová podomítková samouzavírací s hlavou sprchovou + podomítkové těleso	kus	-12,000	9 026,37	-108 316,44
----	---	-----------	--	-----	---------	----------	-------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská - vícepráce rekonstrukce šatny a sociální zázemí

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

43 797,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 797,00	21,00%	9 197,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 994,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská - vícepráce rekonstrukce šatny a sociální zázemí

Objekt:

0

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

43 797,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 882,00

783 - Stavební úpravy - vnitřní, štukování stěn a stropů

31 915,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

43 797,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská - vícepráce rekonstrukce šatny a sociální zázemí

Objekt:

0

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 797,00

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 882,00
13	K	784111041	Omytí podkladu omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	102,000	25,00	2 550,00
14	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	6,000	20,00	120,00
15	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	6,000	1,00	6,00
16	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	6,000	5,00	30,00
17	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	6,000	1,00	6,00
18	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	20,000	25,00	500,00
19	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	102,000	85,00	8 670,00

D		783	Stavební úpravy - vnitřní, štukování stěn a stropů				31 915,00
20	K	783801401	oškábání stávající malby a podkladu stěn a stropů	m2	102,000	55,00	5 610,00
21	K	783813141	Penetrace stěn a stropů	m2	102,000	35,00	3 570,00
22	K	783813142	Dodání a montáž štuková omítka stěn	m2	75,000	185,00	13 875,00
23	K	783817421	Dodání a montáž štuková omítka stropů	m2	28,000	225,00	6 300,00
24	K	7838222.R	Úprava vnitřních povrchů stěn tmelením dvojnásobné	m2	16,000	160,00	2 560,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská - méněpráce bourání betonových ploch

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podm

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

69404828

CZ7507282464

Cena bez DPH

-43 795,50

DPH základní
snížená

Základ daně

-43 795,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-9 197,06

0,00

Cena s DPH

v CZK

-52 992,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská - měněpráce bourání betonových ploch

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

-43 795,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-43 795,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-15 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-9 750,00

997 - Přesun sutě

-16 450,00

998 - Přesun hmot

-1 795,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská - méněpráce bourání betonových ploch

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-43 795,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							-43 795,50	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-15 800,00	
3	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-5,000	2 960,00	-14 800,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	-40,000	25,00	-1 000,00	CS ÚRS 2021 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-9 750,00	
5	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-5,000	1 950,00	-9 750,00	CS ÚRS 2021 01
D 997 Přesun sutě							-16 450,00	
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	-10,000	900,00	-9 000,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-20,000	55,00	-1 100,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-10,000	250,00	-2 500,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-20,000	15,00	-300,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-10,000	355,00	-3 550,00	CS ÚRS 2021 01
D 998 Přesun hmot							-1 795,50	
14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-1,890	950,00	-1 795,50	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace na ZŠ Školní v Klášterci nad Ohří - vícepráce

Objekt:

Učebnicový pavilon U12

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:

SupCon, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

54 788,50

DPH základní
snížená

Základ daně

54 788,50

Sazba daně

21,00%

Výše daně

11 505,59

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

66 294,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace na ZŠ Školní v Kláštecku nad Ohří - vícepráce

Objekt:

Učebnicový pavilon U12

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Adam Vavroušek

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: SupCon, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

54 788,50

HSV - Práce a dodávky HSV

18 630,50

6 - Úpravy povrchu

12 910,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

5 320,00

997 - Přesun hmot HSV

400,50

PSV - Práce a dodávky PSV

36 158,00

721 - Vnitřní kanalizace

27 270,00

771 - Podlahy z dlaždic

3 769,00

781 - Obklady keramické

2 255,00

784 - Malby

2 864,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace na ZŠ Školní v Kláštecku nad Ohří - vícepráce

Objekt:

Učebnicový pavilon U12

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Adam Vavroušek

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: SupCon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 788,50

D HSV Práce a dodávky HSV

18 630,50

D 6 Úpravy povrchu

12 910,00

1	K		Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně (opravné práce)	m	16,000	280,00	4 480,00	CS ÚRS 2020 01
2	K		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m	16,000	135,00	2 160,00	CS ÚRS 2020 01
3	K		Oprava vnitřní vápencocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy po instalaci rozvodu	m	16,000	85,00	1 360,00	CS ÚRS 2020 01
4	K		Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	soubor	1,000	1 260,00	1 260,00	CS ÚRS 2020 01
5	K		Protiprašná opatření, zamezení vnikání prachu do tříd a do místností z chodby	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
6	K		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
7	K		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 kanalizační prostupy	ks	4,000	260,00	1 040,00	CS ÚRS 2020 01
8	K		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	ks	4,000	90,00	360,00	CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce

5 320,00

11	M		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m	16,000	235,00	3 760,00	CS ÚRS 2020 01
12	M		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	ks	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2020 01
13	M		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	ks	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun hmot HSV

400,50

14	K		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,300	105,00	31,50	CS ÚRS 2020 01
15	K		Příplatek ZDK 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	0,300	11,00	3,30	CS ÚRS 2020 01
16	K		Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,300	105,00	31,50	CS ÚRS 2020 01
17	K		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,300	450,00	135,00	CS ÚRS 2020 01
18	K		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZDK 10 m	t	0,300	56,00	16,80	CS ÚRS 2020 01
19	K		Poplatek za uložení směsného odpadu (beton, keramika) na skládce (skládkovné)	t	0,300	360,00	108,00	CS ÚRS 2020 01
20	K		Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	0,300	248,00	74,40	CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV

36 158,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Vnitřní kanalizace				27 270,00	
27	K		Demontáž potrubí litinové do DN 125	m	1,000	175,00	175,00	CS ÚRS 2020 01
28	K		Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	15,000	155,00	2 325,00	CS ÚRS 2020 01
30	K		Demontáž potrubí z PVC do D 50	m	5,000	110,00	550,00	CS ÚRS 2020 01
31	K		Napojení na střešní vpust DN 125 systém HT (pod stropem)	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2020 01
33	K		Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 - se zvýšenou tepelnou odolností	m	5,000	285,00	1 425,00	CS ÚRS 2020 01
35	K		Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 - se zvýšenou tepelnou odolností	m	15,000	425,00	6 375,00	CS ÚRS 2020 01
36	K		Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 125 - se zvýšenou tepelnou odolností	m	1,000	460,00	460,00	CS ÚRS 2020 01
40	K		Osazení čistič kus DN 100	kus	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2020 01
41	K		Třímeny, závěsy, vrtání, hmoždinky, vruty pro zavěšení kanalizace	soubor	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2020 01
42	K		Zkouška těsnosti potrubí	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
43	K		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
53	K		Demontáž zařízení WC D+CH 1NP+2NP	soubor	1,000	3 260,00	3 260,00	CS ÚRS 2020 01
54	K		Opětovná montáž zařízení WC D+CH 1NP + 2NP	soubor	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2020 01
55	K		Demontáž, montáž výlevka	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
D 771			Podlahy z dlaždic				3 769,00	
76	K		Dlaždice keramické (opravné práce)	m2	3,000	555,00	1 665,00	CS ÚRS 2020 01
77	K		Dlaždice keramické sokl s poží. 19,8 x 9,0 x 0,9 cm	kus	3,000	140,00	420,00	CS ÚRS 2020 01
78	M		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,000	108,00	324,00	CS ÚRS 2020 01
79	K		Montáž podlah keramických	m2	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2020 01
80	K		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
D 781			Obklady keramické				2 255,00	
81	K		Obkládačky keramické	m2	2,500	360,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
82	K		Montáž obkládaček vnitřních pórovitých pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	2,500	420,00	1 050,00	CS ÚRS 2020 01
83	M		Demontáž obkladů z obkládaček opakních kladených do malty	m2	2,500	82,00	205,00	CS ÚRS 2020 01
84	K		Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	0,000	115,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
85	M		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
D 784			Malby				2 864,00	
86	K		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,000	48,00	768,00	CS ÚRS 2020 01
87	K		Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,000	13,00	208,00	CS ÚRS 2020 01
88	K		Dvojnásobné nílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,000	118,00	1 888,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - rozvody vody - vícepráce

Objekt:

20201113-12 - Učebnový pavilon U12

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

SupCon, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 245,44

DPH základní
snižená

Základ daně

51 245,44

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 761,54

0,00

Cena s DPH

v CZK

62 006,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - rozvody vody - vícepráce

Objekt:

20201113-12 - Učebnový pavilon U12

Místo:

Zadávatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: SupCon, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	51 245,44
HSV - Práce a dodávky HSV	12 976,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 301,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 543,49
997 - Přesun sutě	1 498,93
998 - Přesun hmot	632,41
PSV - Práce a dodávky PSV	38 268,94
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 042,22
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 255,30
771 - Podlahy z dlaždic	3 252,63
781 - Dokončovací práce - obklady	3 156,19
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 562,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - rozvody vody - vícepráce

Objekt:

20201113-12 - Učebnový pavilon U12

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Datum:

Projekant:

Zpracovatel: SupCon, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 245,44

D HSV Práce a dodávky HSV

12 976,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 301,67

1	K	612135011	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	16,000	158,27	2 532,32	CS ÚRS 2020 01
2	K	612135095	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	16,000	44,07	705,12	CS ÚRS 2020 01
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,000	363,65	363,65	CS ÚRS 2020 01
4	K	612315101	Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,000	801,84	801,84	CS ÚRS 2020 01
5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	3,000	163,57	490,71	CS ÚRS 2020 01
6	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,100	3 740,84	374,08	CS ÚRS 2020 01
7	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	1,000	33,95	33,95	CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 543,49

8	K	953941711	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objímek nebo držáků, ve zdivu cihelném	kus	26,000	99,86	2 596,36	CS ÚRS 2020 01
9	M	28654692	objímka kovová s vrutem D 20-25mm	kus	12,000	42,90	514,80	CS ÚRS 2020 01
10	M	28654694	objímka kovová s vrutem D 32-40mm	kus	2,000	49,20	98,40	CS ÚRS 2020 01
13	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,040	2 761,70	110,47	CS ÚRS 2020 01
14	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	0,500	92,23	46,12	CS ÚRS 2020 01
15	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	bm	3,500	30,53	106,86	CS ÚRS 2020 01
16	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	16,000	93,78	1 500,48	CS ÚRS 2020 01
17	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	0,200	2 850,00	570,00	CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě

1 498,93

18	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,500	1 324,12	662,06	CS ÚRS 2020 01
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,500	10,25	5,13	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,500	333,48	166,74	CS ÚRS 2020 01
21	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,500	710,00	355,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,500	620,00	310,00	CS ÚRS 2020 01
D 998			Přesun hmot				632,41	
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,500	1 264,82	632,41	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				38 268,94	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				15 042,22	
28	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	20,000	62,48	1 249,60	CS ÚRS 2020 01
29	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	2,000	73,68	147,36	CS ÚRS 2020 01
32	K	722170943	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 3/4	kus	1,000	287,27	287,27	CS ÚRS 2020 01
36	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	5,000	298,46	1 492,30	CS ÚRS 2020 01
38	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	16,000	360,56	5 768,96	CS ÚRS 2020 01
47	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	5,000	51,63	258,15	CS ÚRS 2020 01
49	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	16,000	67,01	1 072,16	CS ÚRS 2020 01
52	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50	m	20,000	26,00	520,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	5,000	196,32	981,60	CS ÚRS 2020 01
54	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2	kus	5,000	167,91	839,55	CS ÚRS 2020 01
56	K	722232062	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	kus	1,000	456,14	456,14	CS ÚRS 2020 01
63	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	25,000	45,82	1 145,50	CS ÚRS 2020 01
65	K	722290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,150	1 757,56	263,63	CS ÚRS 2020 01
66	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,12	560,00	CS ÚRS 2020 01
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				15 255,30	
67	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur umyvadel	soubor	4,000	130,74	522,96	CS ÚRS 2020 01
68	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	4,000	1 297,61	5 190,44	CS ÚRS 2020 01
69	M	64211030	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	4,000	1 240,00	4 960,00	CS ÚRS 2020 01
70	M	55111984	baterie nástěnná horní výtok na jednu vodu chrom otočný výtok G 1/2"	kus	4,000	827,00	3 308,00	CS ÚRS 2020 01
71	K	725590813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,150	1 909,71	286,46	CS ÚRS 2020 01
72	K	725810811	Demontáž výtakových ventilů nástěnných	kus	4,000	41,17	164,68	CS ÚRS 2020 01
75	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	4,000	202,69	810,76	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	50,000	0,24	12,00	CS ÚRS 2020 01
D 771			Podlahy z dlaždic				3 252,63	
77	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	bm	3,000	102,06	306,18	CS ÚRS 2020 01
78	M	59761416.LSS	sokl TAURUS COLOR, 100 x 100x 9 mm	bm	3,000	48,00	144,00	
79	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,000	361,03	1 083,09	CS ÚRS 2020 01
80	M	59761409.LSS	dlaždice slinutá TAURUS COLOR, 100 x100x 9 mm	m2	3,000	525,00	1 575,00	
81	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,000	48,12	144,36	CS ÚRS 2020 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				3 156,19	
83	K	781411810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,000	106,54	319,62	CS ÚRS 2020 01
84	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	3,000	507,07	1 521,21	CS ÚRS 2020 01
85	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	3,000	319,00	957,00	CS ÚRS 2020 01
86	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	3,000	48,12	144,36	CS ÚRS 2020 01
87	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	4,000	53,50	214,00	CS ÚRS 2020 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 562,60	
89	K	784111041	Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,000	39,23	156,92	CS ÚRS 2020 01
90	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	4,000	4,83	19,32	CS ÚRS 2020 01
91	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	4,000	0,81	3,24	CS ÚRS 2020 01
92	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	4,000	6,44	25,76	CS ÚRS 2020 01
93	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	4,000	0,81	3,24	CS ÚRS 2020 01
94	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	20,000	17,93	358,60	CS ÚRS 2020 01
95	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,000	62,22	995,52	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní - vícepráce na kompletní výměnu obkladů a dlažeb v koupelnách tělocvičny

Objekt:

Tělocvična

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

IČ:

69404828

DIČ:

7507282464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

165 569,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 569,00	21,00%	34 769,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

200 338,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní - vícepráce na kompletní výměnu obkladů a dlažeb v koupelnách tělocvičny

Objekt:

0

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	165 569,00
------------------------------------	-------------------

771 - Podlahy z dlaždic	37 004,00
-------------------------	-----------

781 - Dokončovací práce - obklady	87 620,00
-----------------------------------	-----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 055,00
--	-----------

783 - Stavební úpravy - vnitřní, štukování stěn a stropů	26 890,00
--	-----------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	165 569,00
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní - vícepráce na kompletní výměnu obkladů a dlažeb v koupelnách tělocvičny

Objekt:

0

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

165 569,00

D 771		Podlahy z dlaždic				37 004,00	
1	K	771473112	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených uložených v cementovém potěru	bm	29,000	55,00	1 595,00
2	M	59761416.LSS	sokl TAURUS COLOR, 100 x 100x 9 mm	bm	20,000	65,00	1 300,00
3	M	59761409.LSS	dlaždice slinutá TAURUS COLOR, 100 x100x 9 mm	m2	33,000	460,00	15 180,00
4	K	771573120	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	29,000	560,00	16 240,00
5	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	29,000	55,00	1 595,00
6	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,470	200,00	1 094,00

D 781		Dokončovací práce - obklady				87 620,00	
7	K	781411810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	86,000	55,00	4 730,00
8	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	86,000	460,00	39 560,00
9	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	100,000	360,00	36 000,00
10	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu (adhézní můstek)	m2	86,000	55,00	4 730,00
11	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	42,000	50,00	2 100,00
12	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	50,000	10,00	500,00

D 784		Dokončovací práce - malby a tapety				14 055,00	
13	K	784111041	Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	110,000	25,00	2 750,00
14	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	15,000	20,00	300,00
15	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	15,000	1,00	15,00
16	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	15,000	5,00	75,00
17	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	15,000	1,00	15,00
18	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojítych nebo zdvojených	m2	62,000	25,00	1 550,00
19	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	110,000	85,00	9 350,00

D 783		Stavební úpravy - vnitřní, štukování stěn a stropů				26 890,00	
20	K	783801401	oškrábání stávající malby a podkladu stěn a stropů	m2	80,000	55,00	4 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	783813141	Penetrace stěn a stropů	m2	80,000	35,00	2 800,00
22	K	783813142	Dodání a montáž štuková omítka stěn	m2	38,000	185,00	7 030,00
23	K	783817421	Dodání a montáž štuková omítka stropů	m2	52,000	225,00	11 700,00
24	K	7838222.R	Úprava vnitřních povrchů stěn tmelením dvojnásobné	m2	6,000	160,00	960,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská vícepráce - kuchyně úprava elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podm

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

69404828

DIČ:

7507282464

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

56 070,55

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

56 070,55

21,00%

11 774,62

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

67 845,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská vícepráce - kuchyně úprava elektroinstalace

Místo:

Datum:

Zadávatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

56 070,55

HSV - Práce a dodávky HSV

7 560,00

PSV - Montážní práce a materiál

48 510,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská vícepráce - kuchyně úprava elektroinstalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] za materiál	Cena celkem [CZK] za materiál	Montáž CZK	Montáž celkem CZK	Cena celkem CZK
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------------	-------------------------------	------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 070,55

D HSV

Dodávky RM10

19 885,55

36 185,00

56 070,55

D 3

6 140,00

1 420,00

7 560,00

1	K		Rozvaděč skříň EASY 9 12TE	ks	1,000	950,00	950,00	900,00	900,00	1 850,00
2	K		Bočnice	ks	1,000	210,00	210,00	115,00	115,00	325,00
3	K		Krycí deska s výřezem 45 mm, plechová, šedá, š=600, v=150	ks	1,000	450,00	450,00	15,00	15,00	465,00
4	K		Hlavní vypínač, 3-pól, 25A	ks	1,000	870,00	870,00	95,00	95,00	965,00
5	K		PL7-PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	1,000	330,00	330,00	35,00	35,00	365,00
6	K		Chránič s nadproud. Ochr., Ir=250A, AC, 1+N pol, char. B, Icn=0.03A, In=10A	ks	2,000	1 350,00	2 700,00	95,00	190,00	2 890,00
7	K		PL7-B10/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn = 10kA, In=10A	ks	1,000	480,00	480,00	35,00	35,00	515,00
8	K		PI7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	1,000	150,00	150,00	35,00	35,00	185,00
9	K		PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks						

PSV

Montážní materiál a práce

13 745,55

34 765,00

48 510,55

34	K		Světlo PIRES ECO DL 250	ks	1,000	920,00	0,00	280,00	0,00	0,00
44	K		Přístroj spínače, přepínače (se šroubovými svorkami), pro Tango, Element, Time							
36	K		Kryt	ks	4,000	120,00	480,00	25,00	100,00	580,00
37	K		Kryt spínače, Tango							
38	K		3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového, d. Tango, b. bílá	ks	4,000	65,00	260,00	25,00	100,00	360,00
39	K		Rámeček, Tango							
136	K		3901A-B10 B Rámeček pro elektrinstalační přístroje, jednonásobný, d. Tango, b.bílá	ks	4,000	25,00	100,00	25,00	100,00	200,00
40	K		Spínač, přepínač kompletní, Tango IP 44							
104	K		3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž, řazení 6 (1), d.Tango, b.bílá	ks	4,000	160,00	640,00	25,00	100,00	740,00
64	K		3558A-05940 B Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž, řazení 5, d.tango, b.bílá	ks	4,000	178,00	712,00	25,00	100,00	812,00
65	K		Zásuvka kompletní, Tango IP 44							
66	K		5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, řazení 2P+PE, d. Tango, b.bílá	ks	4,000	168,00	672,00	155,00	620,00	1 292,00
67	K		KU 68-1901 Krabice univerzální	ks	16,000	7,00	112,00	15,00	240,00	352,00
68	K		KU 68-1902 Krabice odbočná	ks	2,000	10,00	20,00	15,00	30,00	50,00
69	K		Kabel silový, Izolace PVC							
70	K		CYKY -J 3x1,5, pevně	m	70,000	21,00	1 470,00	25,00	1 750,00	3 220,00
71	K		CYKY-J 3x2,5, pevně	m	50,000	35,00	1 750,00	25,00	1 250,00	3 000,00
72	K		CYKY-J, 3x4 pevně	m	25,000	165,00	4 125,00	110,00	2 750,00	6 875,00
73	K		PVC lišta 30x20 plast	m	25,000	110,00	2 750,00	50,00	1 250,00	4 000,00
110	K		Vybourání otvoru ve stěně betonové do průměru 60 mm							
75	K		Stěna	ks	4,000	0,00	0,00	220,00	880,00	880,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] za materiál	Cena celkem [CZK] za materiál	Montáž CZK	Montáž celkem CZK	Cena celkem CZK
105	K		Vybourání drážky strop (panelový monolit) světla, beton do plochy - frézování							
77	K		Strop + stěna do 30 mm	ks	60,000	0,00	0,00	120,00	7 200,00	7 200,00
78	K		Vysekání kapes ve zdivu, beton pro krabice							
81	K		50x50x50 mm	ks	16,000	0,00	0,00	120,00	1 920,00	1 920,00
82	K		150x150x100 mm	ks						
109	K		100x100x50 mm	ks						
83	K		Vysekání rýh v betonových zdech - podlaha hloubka 30 mm							
84	K		šíře 30 mm	m	10,000	0,00	0,00	120,00	1 200,00	1 200,00
106	K		Hodinové zúčtovací sazby							
85	K		Demontáž stávajícího zařízení	hod	8,000	0,00	0,00	325,00	2 600,00	2 600,00
107	K		Úprava stávajícího zařízení	hod	5,000	0,00	0,00	425,00	2 125,00	2 125,00
87	K		Vyhledání připojovacího místa	hod	2,000	0,00	0,00	425,00	850,00	850,00
88	K		Napojení na stávající zařízení	hod	6,000	0,00	0,00	425,00	2 550,00	2 550,00
89	K		Příprava ke kompletní zkoušce							
113	K		Zkušební provoz							
111	K		Zaučení obsluhy							
90	K		Zabezpečení pracoviště							
112	K		Kompletní montáž	hod	8,000	0,00	0,00	425,00	3 400,00	3 400,00
97	K		Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500							
95	K		Revizní technik	hod	4,000	0,00	0,00	650,00	2 600,00	2 600,00
92	K		Spolupráce s revizním technikem	hod	3,000	0,00	0,00	350,00	1 050,00	1 050,00
93	K		Podružný materiál	ks	1,000	654,55	654,55	0,00	0,00	654,55
