



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SD/452/2020/OVR

**„Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská
v Klášterci nad Ohří“**

Město Klášterec nad Ohří

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

zastoupena: Ing. Štefanem Drozdem, starostou

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939

PLÁTCE DPH: ANO

ID datové schránky: 6dqbymc

zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil,  


na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Společnost „TDI pro RD Ciboušovská v Klášterci nad Ohří“

PETROM STAVBY, a. s. (správce společnosti)

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

PLÁTCE DPH: ANO

se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.


zástupce ve věcech smluvních: Petr Kasper, předseda představenstva, 


zástupce ve věcech technických: Ing. Radek Jára, technický ředitel, 


na straně druhé jako zhotovitel

Silnice Topolany a. s. (společník)

IČO: 05758734

DIČ: CZ05758734

PLÁTCE DPH: ANO

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.


zástupce ve věcech smluvních: Marek Volák, předseda představenstva, 


zástupce ve věcech technických: , výrobní ředitel, tel.: 


na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)



uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Preamble

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 23.10.2020 ve znění Dodatku č. 1. ze dne 22.6.2021 (dále jen „smlouva“), kdy jeho předmětem je úprava ceny za dílo z důvodu vzniklých vícenákladů respektive méněprací zjištěných v průběhu realizace a to snížením ceny o 59 864,86 Kč bez DPH tedy o 72 436,48 Kč vč. DPH – viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Změnový list, dále byl ve vazbě na ZL prodloužen termín realizace o 45 dní – viz Příloha č. 2 HMG.

I.

- 1.1. Článek 3 Doba plnění bod 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 315 kalendářních dní ode dne protokolárního předání staveniště (limitní termín).“
- 1.2. Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„ 5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
a. Cena bez DPH 21 335 807,78 Kč (slovy: dvacet jeden milion tři sta třicet pět tisíc osm set sedm korun českých sedmdesát osm haléřů)
b. DPH 21% ve výši 4 480 519,63 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta osmdesát tisíc pět set devatenáct korun českých šedesát tři dvacet pět haléře)
c. Cena včetně DPH ve výši 25 816 327,41 Kč (slovy: dvacet pět milionů osm set osm set šestnáct tisíc tři sta dvacet sedm i korun českých čtyřicet jedna haléřů)
(dále též „**Cena za provedení díla**“).“

II.

- 2.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 2.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 na profilu objednatele






- 2.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 2.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 2.6. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 23.10.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.6. 2021.

Příloha č. 1: změnový list

Příloha č. 2: HMG

Za objednatele: 28-07-2021

Za zhotovitele: 2.8.2021

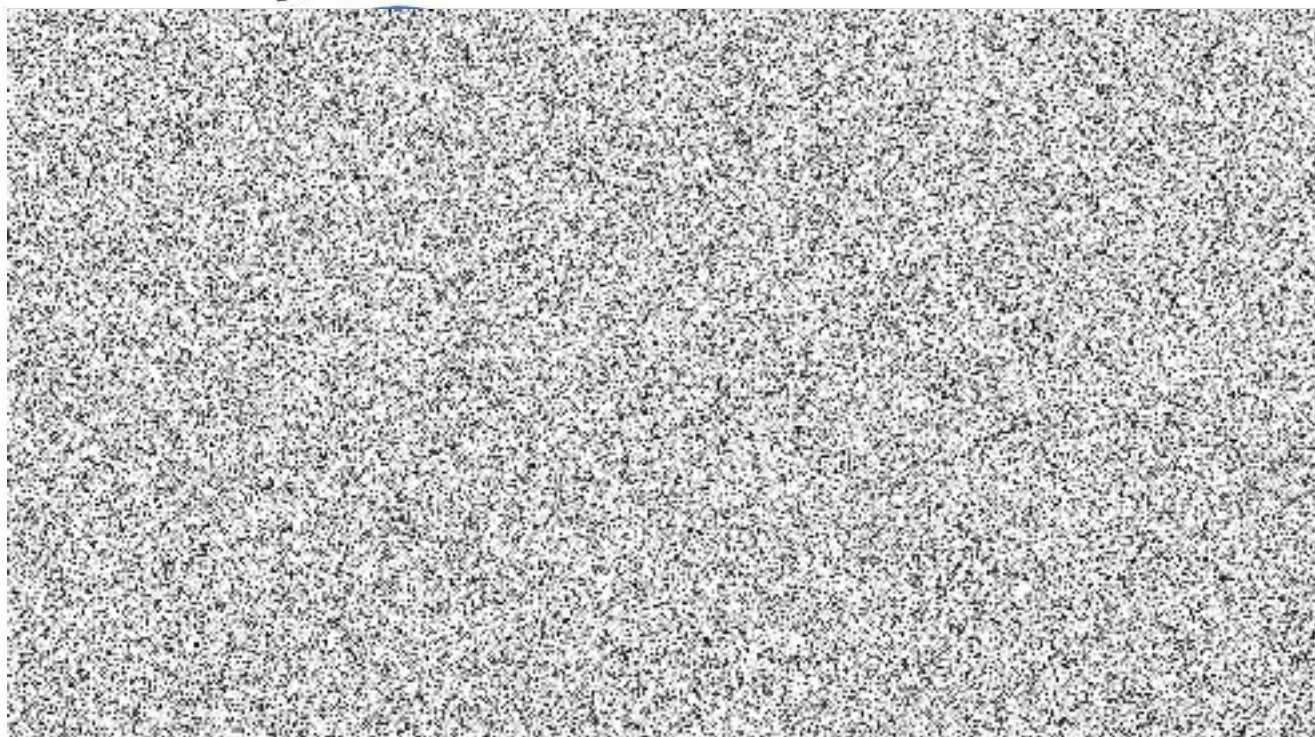

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1 - 13

Datum změny: 15.6. 2021

Název veřejné zakázky: Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Zhotovitel: Společnost pro RD Ciboušovská v Klášterci nad Ohří
Správce společnosti: Petrom stavby, a.s.
Společník: Silnice Topolany, a.s., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny:	Druh financování:	Druh prací:	Stavební oddíly:
VO kanalizace voda VRN	vlastní	Méněpráce Vícepráce	Zemní práce Trubní vedení Zakládání Vodorovné konstrukce Ostatní konstrukce a práce VRN

Popis změn:

1.SO503a – Vodoměrné šachty

Oddíl 2 – Zakládání:

- Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 419,36 Kč bez DPH

Oddíl 8 - Trubní vedení

Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 19 872,00 Kč bez DPH

2. SO 501a – Odpočet žlabů a přípočet UV

Oddíl 8 – Trubní vedení:

- Vícepráce v hodnotě: 45 095,00 bez DPH Méněpráce v hodnotě 0 Kč bez DPH

Oddíl 9 - ostatní konstrukce a práce

Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 334 693,15 Kč bez DPH

3. Objekty trubních vedení SO 501, 501a, SO 502, 502a, SO 503, 503a, SO 504, 504a

Oddíl 1 – Zemní práce:

Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 716 170,40 Kč bez DPH

Oddíl 1 – zakládání:

Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 412 147,80 Kč bez DPH

4. SO 100 – objekty pozemních komunikací , úprava zemin aktivní zóny

Oddíl 5 – komunikace pozemní

Vícepráce v hodnotě: 663 282,60 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 131 232,92 Kč bez DPH

5. Třídění zeminy vč přesunu hmot

Oddíl 1 – Zemní práce:

Vícepráce v hodnotě: 708 253,24 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 0 Kč bez DPH

6. SO 501 - Náhrada pískového lože

Oddíl 4 – Vodorovné konstrukce:

Vícepráce v hodnotě: 48 548,00 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 39 388,00 Kč bez DPH

7. SO 501 a SO 502 Sanace podloží pod betonové šachty

Oddíl 1 - zemní práce

Vícepráce v hodnotě: 1 279,25 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 0 Kč bez DPH

Oddíl 4 – Vodorovné konstrukce:

Vícepráce v hodnotě: 3 128,00 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 0 Kč bez DPH

8. SO 502 změna obsypu potrubí

Oddíl 1 - zemní práce

Vícepráce v hodnotě: 15 730,36 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 8 210,00 Kč bez DPH

9. SO 502 – nová napojovací šachta

Oddíl 8 – Trubní vedení:

Vícepráce v hodnotě: 11 959,50 Kč bez DPH Méněpráce v hodnotě 0 Kč bez DPH

Oddíl 9 - ostatní konstrukce a práce

Vícepráce v hodnotě: 3 114,00 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě 0 Kč bez DPH

10. SO 401 – lampy VO

Oddíl 2 – Zakládání:

- Vícepráce v hodnotě: 0 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 12 022,06 Kč bez DPH

Oddíl 3 - svislé konstrukce

Vícepráce v hodnotě: 78 858,600 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 0 Kč bez DPH

Oddíl 21 M – Elektromontáže

Vícepráce v hodnotě: 25 927,48 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 159 546,50 Kč bez DPH

11. SO 503 – bypass vodovodního řádu

Oddíl 1 – Zemní práce:

Vícepráce v hodnotě: 7 320,30 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 0 Kč bez DPH

Oddíl 8 - Trubní vedení

Vícepráce v hodnotě: 78 874,00 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 0 Kč bez DPH

12. VRN 6 - čerpání vody

Územní vlivy

Vícepráce v hodnotě: 12 467,00 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 0 Kč bez DPH

13. VRN 3 – zařízení staveniště

Zařízení staveniště

Vícepráce v hodnotě: 70 000,- Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 0 Kč bez DPH

Vícepráce v celkové hodnotě 1 773 837,33 Kč bez DPH.

Méněpráce v celkové hodnotě – 1 833 702,19 Kč bez DPH.

Zdůvodnění změn:

1.změna: Vodoměrné šachty

V PD byla řešena výměna vodovodních šachet 3 stávajících RD , které nebudou z rozhodnutí objednatele

Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Tyto změny by způsobily zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení.

2.změny: Odpočet žlabů a přípočet UV

Na základě požadavků a návrhu objednatele nebudou dodány odvodňovací prvky komunikací a to konkrétně žlaby. Jedná se především o žlaby z vjezdů a retardérů v ul. Ciboušovská

Místo nich budou osazeny jednoduché uliční vpusti.

Odvodnění v nové komunikaci „lokalita Ciboušovská“ a z MK ul. Ciboušovská bude svedeno do retenčního příkopu, popřípadě horské vpusti, uličních vpustí.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

3.změna: Objekty trubních vedení

Tento návrh změny řeší záměnu zásypového materiálu z objektů trubního vedení – kanalizace vč. přípojek dešťové i splaškové, vodovodu, plynovodu, ochrany VTL bude odečten veškerý zásypový materiál z netříděného písku. Důvodem odečtů bude použití materiálů z výkopku z místních poměrů s nutností jeho následného vytřídění tak, aby byl zbaven kamení a frakce nad 63mm a nedošlo tak k možnému poškození potrubí. Tímto opatřením bude zajištěna homogenita materiálu v celé šířce zemní pláně pod budoucí asfaltovou komunikací. Uvažovaná změna přinese finanční úsporu a to při dodržení všech kvalitativních podmínek objednatele.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Nové položky představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám uvedeným ve změně č. 5.

4. změna: SO 100 - objekty pozemních komunikací, úprava zemin aktivní zóny

Stávající materiál, který se nachází v dané lokalitě a bylo uvažováno s jeho lokální sanací, není dle rozboru a vyhodnocení geotechnikem do aktivní zóny vhodný a doporučuje tzv. stabilizaci „Goesolem“...- viz protokol zkoušky- rozboru odebraných zemin. Tímto opatřením tak dojde ke sjednocení parametrů zemin v aktivní zóně v celé šířce zemní pláně pod budoucí komunikací.

V této změně bude odečtena sanace bet. recyklátem, odkopávky a prokopávky a bude připočítáno zřízení podkladu ze zeminy s vápnem, cementem.

*Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.*

5. změna: Třídění zeminy vč přesunu hmot

Zhotovitel předkládá návrh změny na úpravu resp. vytřídění zásypového materiálu pro všechny trasy inženýrských sítí. Pro zásyp rýh bude použit materiál vytěžený v dané lokalitě, bude odstraněno kamení a zrna větší jak 63 mm a následně bude tento materiál vrácen do zásypů, tedy do objemu zemního tělesa pod budoucí komunikací.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

6. změna: SO 501 – náhrada pískového lože

Na základě návrhu geotechnika bude v úseku napojovací šachty Š10 a dešťové kanalizace DŠ 9-12 provedena změna obsypu potrubí dešťové a splaškové kanalizace ze štěrkopísku frakce 0/4 na frakci 8/16. Důvodem návrhu změny, je lokální výskyt pramenů spodní vody a toto opatření povede k zamezení odplavení pískového lože pod potrubím a následnému poklesu zemin v násypu zemního tělesa.

*Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.*

7. změna: SO 501 a SO 502 Sanace podloží pod betonové šachty

Z důvodů přítoku spodní vody při výstavbě kanalizačních šachet splaškové a dešťové kanalizace objektu SO502 (Š napojovací – Š10), SO 501(DŠ 12-DŠ 9) bude řešena sanace podloží pod šachtová dna v tl. 30cm kamenivem fr.63/125, dále bude proveden betonový základ v souladu s PD.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.

8. změna: SO 502 změna obsypu potrubí

Na základě návrhu geotechnika bude provedena změna obsypu potrubí v daných metrech délky ze štěrkopísku 0/4 na fr 8/16... na objektu splaškové kanalizace SO 502(úseky mezi Š napojovací – Š10)Z důvodů neustálého přítoku spodní vody bylo schváleno řešení s obsypem fr8/16, protože obsypy ze štěrkopísku 0/4 jsou v takových podmínkách nevhodné a mohlo by docházet k jejich odplavení.

*Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. J*

9. změna: SO 502 – nová napojovací šachta

V PD bylo počítáno s napojením splaškové kanalizace do stávající šachty, ta však nebyla při realizaci objevena. Napojovací šachta splaškové kanalizace v ulici Ciboušovská nebyla součástí rozpočtu.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla..

10. změna: SO 401 – VO

V PD byly navrženy podél ul. Ciboušovské lampy VO. Při realizaci bylo zjištěno, že není nutná realizace neboť stávající lampy na levé straně komunikace plně osvětlí i nově realizovaný chodník. Na základě rozhodnutí objednatele nebude dodáváno 10ks lamp veřejného osvětlení podél ulice Ciboušovská. Dodávka uvedených lamp veřejného osvětlení bude z rozpočtu včetně montáží, vystrojení odečtena.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Dále bylo zjištěno, že rozpočtu VO nepočítal projektant s nadzemní částí rozvodů kabelů nutných pro napojení stožárů lamp VO. Bude přičten bude silový kabel s chráničkou včetně montáží.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

11. SO 503 – bypass vodovodního řadu

Z důvodu propojení splaškové a dešťové kanalizace v ulici Ciboušovská je nutné vytvoření bypassu na vodovodním řadu, jelikož stávající nestandardní uložení vodovodního řadu svou trasou kříží ve stejné hloubce nově navrženou splaškovou a dešťovou kanalizací. Navržený bypass bude proveden při dohledu správcem vodovodního řadu – společností SČVK

*Změna je podřazena pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.*

12. VRN – čerpání vody ze zaplavené rýhy vč. odvozu

Z důvodů neustálého přítoku spodní vody z důvodu nevhodných klimatických podmínek při výstavbě splaškové a dešťové kanalizace bylo nutné nad rámec rozpočtu odčerpávání vody za pomoci čerpadla i sacího vozu.

*Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.*


13. VRN – zařízení staveniště

Z důvodu přerušení prací vlivem nevhodných klimatických podmínek i z důvodu kolize při pokládce kabelů společností ČEZ zhotovitel požádal o prodloužení termínu realizace o 45 kalendářních dní. Z tohoto důvodu je potřeba navýšení položky na zařízení staveniště, ve které je vyčísleno oplocení, kontejnery, kancelářské buňky, provoz, údržba zařízení stavby. Přerušování prací vlivem nevhodných klimatických podmínek i omezení prací z koordinačních důvodů s pokládkou kabelů VN je zaznamenáno ve stavebním deníku a v zápisech z KD.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změny v dodatku č. 2 jsou podřazeny pod § 222 odst. 4, 5, 6 a 7. Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 jsou splněny. Cenový nárůst pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 ve znění dodatku č.

2 v návaznosti na § 222 odst. 9 ZZVZ v limitu 30 % není překročen.

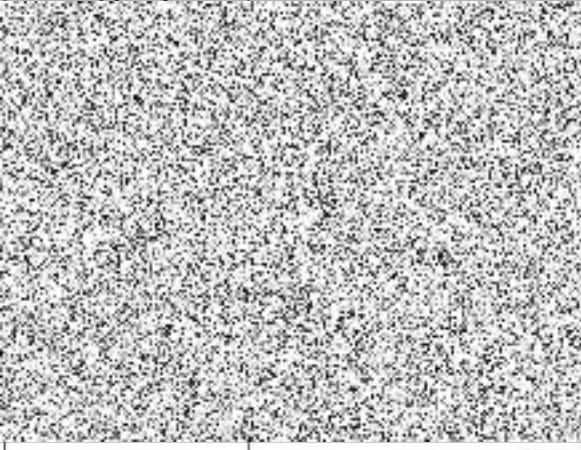Posouzení změny – technický dozor investora: Ing. Ota Vettermann Se změnami souhlasím.			Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO	Doba realizace:	315 kalendářních dnů
Dopady:	Do ceny:	Snížení ceny o: Bez DPH	Bilance: - 59 864,86 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: Bez DPH	1 773 837,33Kč	
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně bez DPH			21 335 807,78 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele:	Petr Kasper		Datum, podpis:	
				
Zástupce objednatele:	Vlastimil Dokoupil			
	Jana Kühnerová			

**Akce: Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří**

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK Č.2

Číslo změny	Název	CENA
1	SO 503a - Vodoměrné šachty - odpočet	-20 291,36
2	SO 501a - Odpočet žlabů a přípočet UV	-289 598,15
3	Objekty trubních vedení - odpočet zásypového materiálu	-1 128 318,20
4	SO 100 - Objekty pozemních komunikací - Úprava zemin aktivní zóny	532 049,68
5	Třídění zeminy včetně vnitrostaveništního přesunu	708 253,24
6	SO 501 - náhrada pískové lože	9 160,00
7	SO 501 a SO 502 - sanace lože pod betonové šachty	4 407,25
8	SO 502 - změna obsypu potrubí	7 520,36
9	SO 502 - nová napojovací šachta	15 073,50
10	SO 401 - veřejné osvětlení	-66 782,48
11	SO 503 - bypass vodovodního řadu	86 194,30
12	VRN - Čerpání vody ze zaplavené rýhy včetně odvozu	12 467,00
13	VRN - Zařízení staveniště	70 000,00
	CELKEM CENA BEZ DPH	-59 864,86

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.1

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 503a - Vodoměrné šachty - odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-20 291,36

DPH základní
snížená

Základ daně
-20 291,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-4 261,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

-24 552,55

SOUPIS PRACÍ - změna č.1

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 503a - Vodoměrné šachty - odpočet

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-20 291,36	
D HSV Práce a dodávky HSV							-20 291,36	
D 2 Zakládání							-419,36	
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-3,328	125,00	-416,03	CS ÚRS 2019 01
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-0,666	5,00	-3,33	CS ÚRS 2019 01
D 8 Trubní vedení							-19 872,00	
32	K	893811152	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro bezne zařízení průměru do 1,0 m hloubky do 1,5 m	kus	-3,000	684,00	-2 052,00	CS ÚRS 2019 01
33	M	56230583	šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m	kus	-3,000	5 940,00	-17 820,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.2

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Kláštecku nad Ohří

Objekt:

SO 501a - Odpočet žlabů a přípočet UV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-289 598,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-289 598,15	21,00%	-60 815,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-350 413,76

SOUPIS PRACÍ - změna č.2

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 501a - Odpočet žlabů a přípočet UV

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-289 598,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

-289 598,15

D 8

Trubní vedení

45 095,00

37	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	1 360,00	6 800,00	CS ÚRS 2019 01
38	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	5,000	308,00	1 540,00	CS ÚRS 2019 01
39	M	BTL.0006305.URS	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	5,000	451,00	2 255,00	CS ÚRS 2019 01
40	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	5,000	242,00	1 210,00	CS ÚRS 2019 01
41	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	5,000	495,00	2 475,00	CS ÚRS 2019 01
42	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	5,000	187,00	935,00	CS ÚRS 2019 01
43	M	BTL.0006314.URS	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	5,000	506,00	2 530,00	CS ÚRS 2019 01
44	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 180,00	5 900,00	CS ÚRS 2019 01
45	M	WVN.RF740006W	LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ 600/D400, 420X620	kus	5,000	4 290,00	21 450,00	CS ÚRS 2019 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-334 693,15

46	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	-46,000	96,70	-4 448,20	CS ÚRS 2019 01
47	M	59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	-79,545	99,90	-7 946,55	CS ÚRS 2019 01
48	M	59227723R1	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm s krycí mříží	kus	-63,636	3 150,00	-200 453,40	
49	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-32,000	420,00	-13 440,00	CS ÚRS 2019 01
50	M	59227006R1	Polymerbetonový žlab monoblok (celistvý) černá, bez spádu dna 0,15/0,23m dl1,0m	kus	-25,000	2 103,20	-52 580,00	
51	M	59227006R2	Polymerbetonový rev díl monoblok (celistvý) černá, 0,15/0,23m, dl 0,5m	kus	-7,000	3 440,80	-24 085,60	
52	M	59227006R3	Polymerbetonový žlab vpust' černá, 0,15/0,5m, dl 0,5m	kus	-7,000	3 898,40	-27 288,80	
53	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	-14,000	317,90	-4 450,60	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.3

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

Objekty trubních vedení - odpočet zásypového materiálu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2021

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 128 318,20

DPH základní
snížená

Základ daně
-1 128 318,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-236 946,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 365 265,02

SOUPIS PRACÍ - změna č.3

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

Objekty trubních vedení - odpočet zásypového materiálu

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 128 318,20	
D	HSV		SO 501 - Dešťová kanalizace				-193 369,20	
D	1		Zemní práce				-122 736,03	
16	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-436,007	180,00	-78 481,30	CS ÚRS 2019 01
17	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-436,007	42,00	-18 312,30	CS ÚRS 2019 01
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-436,007	10,00	-4 360,07	CS ÚRS 2019 01
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-719,412	30,00	-21 582,36	CS ÚRS 2019 01
D	2		Zakládání				-70 633,17	
21	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	-784,813	90,00	-70 633,17	CS ÚRS 2019 01
D	HSV		SO 502 - Splašková kanalizace				-410 546,71	
D	1		Zemní práce				-260 583,76	
16	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-925,697	180,00	-166 625,50	CS ÚRS 2019 01
17	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-925,697	42,00	-38 879,28	CS ÚRS 2019 01
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-925,697	10,00	-9 256,97	CS ÚRS 2019 01
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-1 527,400	30,00	-45 822,01	CS ÚRS 2019 01
D	2		Zakládání				-149 962,95	
21	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	-1 666,255	90,00	-149 962,95	CS ÚRS 2019 01
D	HSV		SO 503 - Vodovod				-138 606,08	
D	1		Zemní práce				-87 976,58	
12	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-312,528	180,00	-56 255,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-312,528	42,00	-13 126,17	CS ÚRS 2019 01
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-312,528	10,00	-3 125,28	CS ÚRS 2019 01
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-515,671	30,00	-15 470,13	CS ÚRS 2019 01
D	2		Zakládání				-50 629,50	
17	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	-562,550	90,00	-50 629,50	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	HSV		SO 504 - Plynovod včetně přípojek				-258 649,20	
D	1		Zemní práce				-164 170,80	
14	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-583,200	180,00	-104 976,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-583,200	42,00	-24 494,40	CS ÚRS 2019 01
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-583,200	10,00	-5 832,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-962,280	30,00	-28 868,40	CS ÚRS 2019 01
D	2		Zakládání				-94 478,40	
19	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	-1 049,760	90,00	-94 478,40	CS ÚRS 2019 01
D	HSV		SO 502a - Přípojky splaškové kanalizace				-52 756,54	
D	1		Zemní práce				-33 485,83	
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-118,955	180,00	-21 411,90	CS ÚRS 2019 01
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-118,955	42,00	-4 996,11	CS ÚRS 2019 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-118,955	10,00	-1 189,55	CS ÚRS 2019 01
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-196,276	30,00	-5 888,27	CS ÚRS 2019 01
D	2		Zakládání				-19 270,71	
16	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	-214,119	90,00	-19 270,71	CS ÚRS 2019 01
D	HSV		SO 501a - Přípojky dešťové kanalizace, odvodnění PK				-45 559,03	
D	1		Zemní práce				-28 917,40	
13	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-102,726	180,00	-18 490,70	CS ÚRS 2019 01
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-102,726	42,00	-4 314,50	CS ÚRS 2019 01
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-102,726	10,00	-1 027,26	CS ÚRS 2019 01
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-169,498	30,00	-5 084,94	CS ÚRS 2019 01
D	2		Zakládání				-16 641,63	
18	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	-184,907	90,00	-16 641,63	CS ÚRS 2019 01
D	HSV		SO 503a - Přípojky vodovod				-22 622,44	
D	1		Zemní práce				-14 359,00	
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-51,009	180,00	-9 181,60	CS ÚRS 2019 01
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-51,009	42,00	-2 142,37	CS ÚRS 2019 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-51,009	10,00	-510,09	CS ÚRS 2019 01
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-84,165	30,00	-2 524,94	CS ÚRS 2019 01
D	2		Zakládání				-8 263,44	
16	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	-91,816	90,00	-8 263,44	CS ÚRS 2019 01
D	HSV		SO 504a - Ochrana stávajícího VTL plynovodu				-6 209,00	
D	1		Zemní práce				-3 941,00	
21	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-14,000	180,00	-2 520,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-14,000	42,00	-588,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-14,000	10,00	-140,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-23,100	30,00	-693,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Zakládání				-2 268,00	
26	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	-25,200	90,00	-2 268,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.4

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací - Úprava zemin aktivní zóny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

532 049,68

DPH základní
snížená

Základ daně
532 049,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
111 730,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

643 780,11

SOUPIS PRACÍ - změna č.4

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací - Úprava zemin aktivní zóny

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

532 049,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

532 049,68

D 5

Komunikace pozemní

532 049,68

5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-151,190	78,00	-11 792,82	CS ÚRS 2019 01
16	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	m2	-755,950	158,00	-119 440,10	CS ÚRS 2019 01
	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 1000 m2	m2	3 383,100	104,00	351 842,40	CS ÚRS 2020 02
	M	CMX.0005T13.0K	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Prachovice Geosol (Dorosol) C 50	t	52,770	3 285,00	173 349,45	CS ÚRS 2020 02
	K		Rozbor zemin vč.stanovení jejich úpravy	kpl.	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2020 02
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 545,450	35,00	124 090,75	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.5

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

Třídění zeminy včetně vnitrostaveništního přesunu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

708 253,24

DPH základní
snižená

Základ daně
708 253,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
148 733,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

856 986,42

SOUPIS PRACÍ - změna č.5

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášteřci nad Ohří

Objekt:

Třídění zeminy včetně vnitrostaveništního přesunu

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

708 253,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

708 253,24

D 1

Zemní práce

708 253,24

1	K	111R0001	Vnitrostaveništní doprava - nakladač	hod	119,000	1 350,00	160 650,00	
2	K	111R0002	Vnitrostaveništní doprava - traktorbagr	hod	119,000	850,00	101 150,00	
3	K	111R0003	Vnitrostaveništní doprava - nákladní auto	hod	119,000	850,00	101 150,00	
4		111R0004	Provoz třídící linky	hod	119,000	2 650,00	315 350,00	

P

Poznámka k položce:
předpokládaný výkon 50t/hod
5953,24/50=119,00

5	K	111R0005	Doprava třídící linky	kpl.	2,000	12 000,00	24 000,00	
6	M	10364100	zemina zásypová - tříděná	t	5 953,240	1,00	5 953,24	

P

Poznámka k položce:
4579,42t + 30% odpadu = 5953,24 t
předpokládaný výkon třídící 50t/hod
4579,42*1,3=5953,24

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.6

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 501, SO502 - Náhrada pískového lože

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2021

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 160,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 160,00	21,00%	1 923,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 083,60

SOUPIS PRACÍ - změna č.6

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 501, SO502 - Náhrada pískového lože

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 160,00

D HSV SO 501 Dešťová kanalizace, SO 502 Splašková kanalizace

9 160,00

D 4 Vodorovné konstrukce

9 160,00

1	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	-45,800	860,00	-39 388,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 8-16 mm	m3	45,800	1 060,00	48 548,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.7

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 501 a SO 502 - Sanace podloží pod betonové šachty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 407,25

DPH základní
snižená

Základ daně

4 407,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

925,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 332,77

SOUPIS PRACÍ - změna č.7

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 501 a SO 502 - Sanace podloží pod betonové šachty

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 407,25

D HSV Práce HSV

4 407,25

D 1 Zemní práce

1 279,25

8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	3,500	125,00	437,50	CS ÚRS 2019 01
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,700	5,00	3,50	CS ÚRS 2019 01
16	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,500	180,00	630,00	CS ÚRS 2019 01
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,500	10,00	35,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5,775	30,00	173,25	CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce

3 128,00

	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	11,500	272,00	3 128,00	CS ÚRS 2020 02
--	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.8

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 502 - Změna obsypu potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 520,36

DPH základní
snížená

Základ daně

7 520,36

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 579,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 099,64

SOUPIS PRACÍ - změna č.8

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 502 - Změna obsypu potrubí

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 520,36

D HSV Práce HSV

7 520,36

D 1 Zemní práce

7 520,36

23	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	-32,840	250,00	-8 210,00	CS ÚRS 2019 01
	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	32,840	479,00	15 730,36	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.9

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 502 - Nová napojovací šachta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 073,50

DPH základní
snížená

Základ daně

15 073,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 165,44

0,00

Cena s DPH

v CZK

18 238,94

SOUPIS PRACÍ - změna č.9

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 502 - Nová napojovací šachta

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

15 073,50

D 8 Trubní vedení

15 073,50

1	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2019 01
2	M	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm	kus	1,000	5 170,00	5 170,00	CS ÚRS 2019 01
3	M	BTL.0006185.URS	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	1,000	1 419,00	1 419,00	CS ÚRS 2019 01
4	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	170,50	170,50	CS ÚRS 2019 01

11 959,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 114,00

5	K	953171004	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	606,00	606,00	CS ÚRS 2019 01
6	M	55241031	poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací	kus	1,000	2 508,00	2 508,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.10

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 401 - veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-66 782,48

DPH základní
snížená

Základ daně
-66 782,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-14 024,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

-80 806,80

SOUPIS PRACÍ - změna č.10

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 401 - veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-66 782,48	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				66 836,54	
	D	2	Zakládání				-12 022,06	
11	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	-3,312	3 629,85	-12 022,06	CS ÚRS 2018 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				78 858,60	
13	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	120,000	268,80	32 256,00	CS ÚRS 2017 01
14	M	345713540	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	m	138,000	337,70	46 602,60	CS ÚRS 2017 01
	D	M	Práce a dodávky M				-133 619,02	
	D	21-M	Elektromontáže				-133 619,02	
17	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do12 m	kus	-10,000	1 423,80	-14 238,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	21020401R1	Montáž svítidel	ks	-10,000	401,10	-4 011,00	
20	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	-10,000	512,40	-5 124,00	CS ÚRS 2017 01
21	M	3544206R2	Elektrovýzbroj stožárů	ks	-10,000	933,66	-9 336,60	
22	M	31674111	stožár osvětlovací uliční specifikace viz PD	kus	-10,000	4 252,50	-42 525,00	CS ÚRS 2019 01
25	M	3544206R1	Uzemňovací svorky	ks	-10,000	65,42	-654,20	
27	M	21020X02	Svítidlo VO specifikace viz PD	ks	-10,000	8 365,77	-83 657,70	
28	K	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	113,000	38,96	4 402,48	CS ÚRS 2017 01
29	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	100,000	215,25	21 525,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.11

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 503 - bypass vodovodního řadu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

86 194,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 194,30	21,00%	18 100,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 295,10

SOUPIS PRACÍ - změna č.11

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 503 - bypass vodovodního řadu

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 194,30

D HSV Práce a dodávky HSV

86 194,30

D 1 Zemní práce

7 320,30

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	16,900	125,00	2 112,50	CS ÚRS 2019 01
2	K	132201209	Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,380	5,00	16,90	CS ÚRS 2019 01
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,700	35,00	94,50	CS ÚRS 2019 01
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,200	87,00	1 235,40	CS ÚRS 2019 01
5	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	25,560	90,00	2 300,40	CS ÚRS 2019 01
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,700	128,00	345,60	CS ÚRS 2019 01
7	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	4,860	250,00	1 215,00	CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení

78 874,00

8	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	24,000	137,00	3 288,00	
9	M	28613531	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	24,000	437,00	10 488,00	
10	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR 11 110mm	kus	4,000	336,00	1 344,00	
11	M	28654410	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 110	kus	4,000	691,00	2 764,00	
12	M		HAWLE Synoflex DN 100/125	kus	1,000	7 189,00	7 189,00	
13	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	268,00	536,00	
14	M	28653060	elektrotvarovka-PE koleno 90° DN 90	kus	2,000	795,00	1 590,00	
15	K	877261112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	4,000	297,00	1 188,00	
16	M	28614937	elektrotvarovka-PE koleno 90° DN 110	kus	4,000	1 170,00	4 680,00	
17	K	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	10,000	295,00	2 950,00	
18	M	28615975	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm	kus	10,000	389,00	3 890,00	
19	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	268,00	268,00	
20	M		HAWLE souprava zavzdušňovací a odvzdušňovací DN 80/1055 č.9822	kus	1,000	26 183,00	26 183,00	
21	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	471,00	471,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	55253515	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000	4 530,00	4 530,00	
23	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	829,00	829,00	
24	M		HAWLE poklop č.1790	kus	1,000	6 686,00	6 686,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.12

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

VRN - Čerpání vody ze zaplavené rýhy včetně odvozu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 467,00

DPH základní
snížená

Základ daně

12 467,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 618,07

0,00

Cena s DPH

v CZK

15 085,07

SOUPIS PRACÍ - změna č.12

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

VRN - Čerpání vody ze zaplavené rýhy včetně odvozu

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 467,00

D HSV Práce a dodávky HSV

12 467,00

D 1 Zemní práce

12 467,00

1	K	HZ51292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - obsluha čerpacího zařízení	hod	14,000	323,00	4 522,00	CS ÚRS 2020 02
2	S	304090011100	Fekální sací vůz objem 10,1 m3	Sh	14,000	399,00	5 586,00	CS ÚRS 2020 02
3	P	832000-S2-T3	Řidič	Nh	14,000	168,50	2 359,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.13

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

VRN - zařízení staveniště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 000,00	21,00%	14 700,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 700,00

SOUPIS PRACÍ - změna č.13

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

VRN - zařízení staveniště

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

70 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště


70 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

P 420 000 / 270dni = 1 555,55 / den

P 1 555,55/den * 45dni = 69 999,75= 70 000,-

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ:

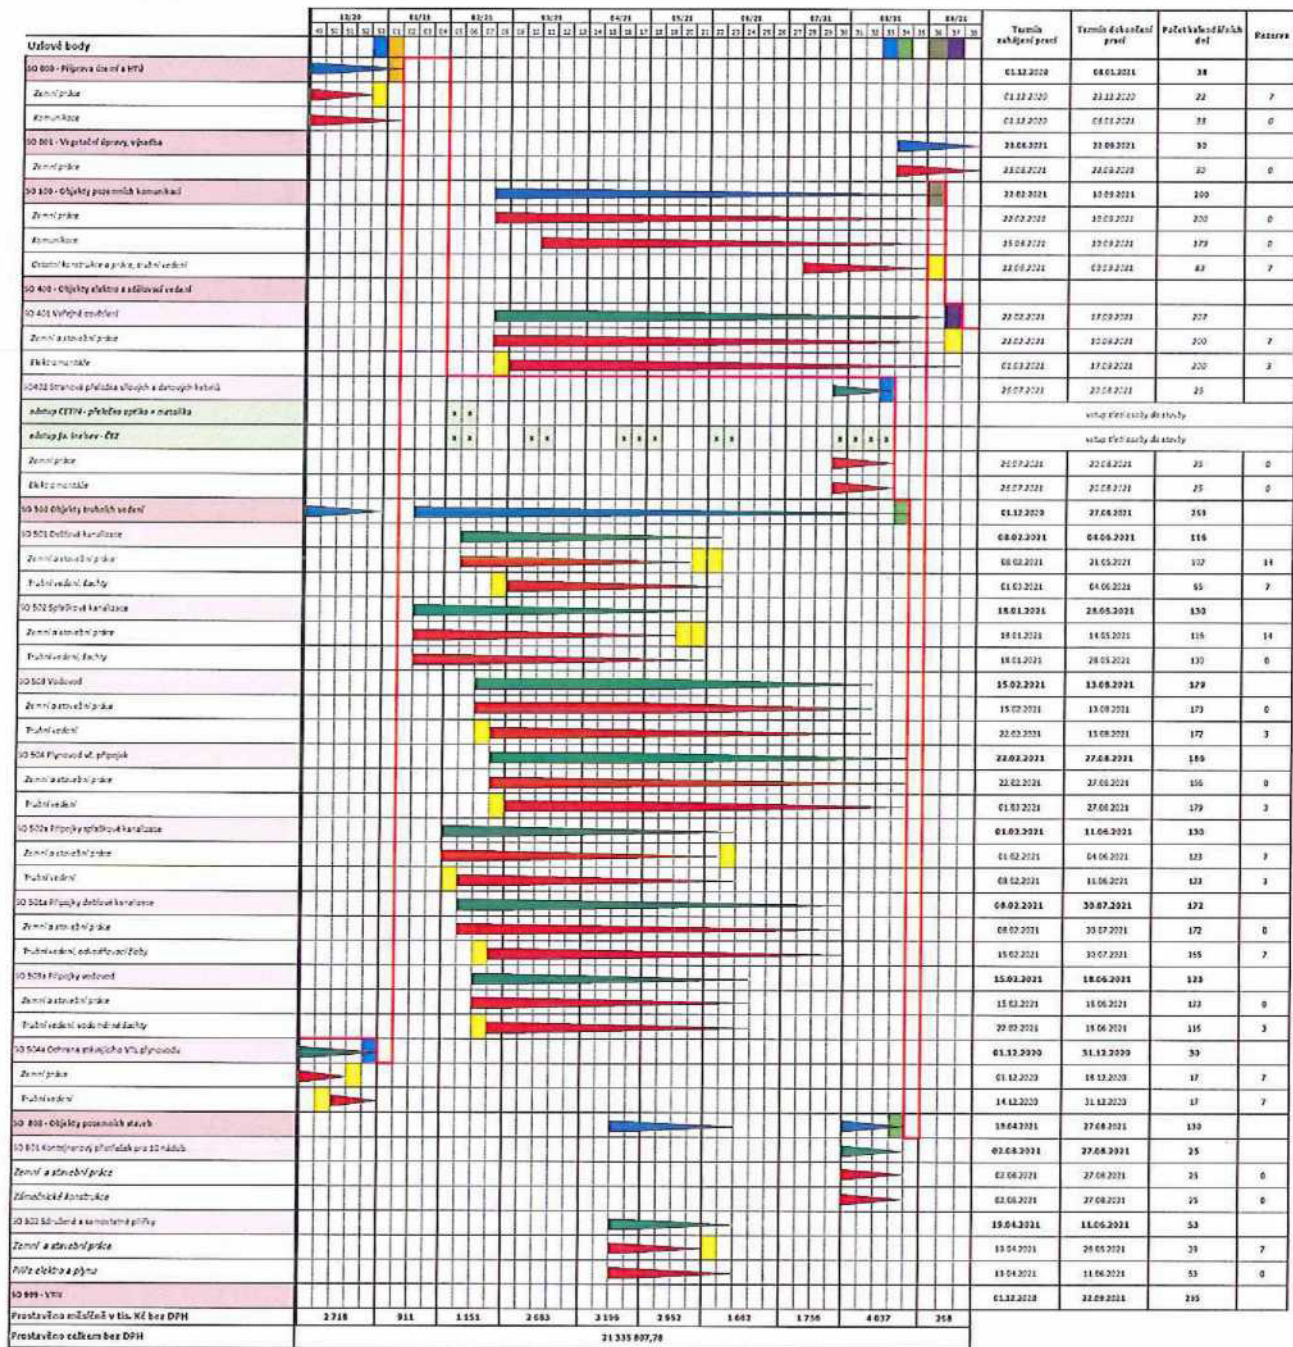

Legenda uzlových bodů:
 1. Děkujeme Vám
 do 08.01.2021
 2a. Děkujeme stranou přílohy stávajících a nových kabelů
 do 30.06.2021
 2b. Děkujeme stranou stávající VTL, příloha
 do 31.12.2020
 3. Děkujeme stranou stávajících st. (SO 500, SO 802)
 do 17.06.2021
 4. Děkujeme stranou stávajících příloh
 do 18.06.2021
 5. Děkujeme stranou stávajícího osvětlení
 do 17.06.2021

Děkujeme za realizaci
