



**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO
Č. SD/393/2019/OVR**

„Cyklostezka podél Kláštereckého potoka, Klášterec nad Ohří“

Město Klášterec nad Ohří

zastoupené: Ing. Štefanem Drozdem, starostou

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939

PLÁTCE DPH: ANO

ID datové schránky: 6dqbymc

zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil, tel.: 



na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Sdružení Cyklostezka Klášterec nad Ohří

Vedoucí společník STAVMAX Group s.r.o.

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090

PLÁTCE DPH: ANO

se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39586

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 

Společník PETROM STAVBY, a.s.

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

PLÁTCE DPH: ANO

Se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 20765

zástupce ve věcech smluvních: Jiří Bezděk - jednatel

zástupce ve věcech technických: 

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Preambule

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo ze dne 29.10.2019, ve znění dodatku č.1 ze dne 12.03.2020, ve znění dodatku č.2 ze dne 19.06.2020 (dále jen „smlouva“) v souladu s Článkem III. bodu 3.8. smlouvy z důvodu rekonstrukce plynovodu v části úseku A cyklostezky a z důvodu úpravy ceny dle skutečně provedených prací (podrobný popis je uveden ve změnovém listě – příloha č.2 tohoto dodatku).



Z těchto důvodů dochází k prodloužení doby provedení díla o 26 dní a k úpravě ceny (ponížení) o 5 498,35 Kč bez DPH (DPH činí 1 154,65 Kč, celkem tedy 6 653,00 Kč s DPH).

Článek 1 Předmět dodatku

- 1.1. Článek III. Doba plnění bod 3.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto :

„ Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 227 kalendářních dní od předání staveniště (limitní termín).“

- 1.2. Článek V. Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto :

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	13 563 953,98 Kč
DPH 21%	2 848 430,34 Kč
Cena včetně DPH ve výši	16 412 384,32 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“).

- 1.3. Podrobný harmonogram výstavby resp. Příloha č. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním. Nové znění Přílohy č. 2 smlouvy je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jako Příloha č. 3.

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají beze změny.
- 2.2. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají beze změny.
- 2.3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 2.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 na profilu objednatele .
- 2.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 2.6. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou,



odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

- 2.7. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 29.10.2019, ve znění dodatku č.1 ze dne 12.03.2020, ve znění dodatku č.2 ze dne 19.06.2020.


Příloha č. 1 : Cenová nabídka zhotovitele (rozpočet)

Příloha č. 2 : Změnový list stavby

Příloha č. 3: Podrobný harmonogram výstavby

Za objednatele: 11-09-2020

Za zhotovitele: 11-09-2020



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190813/01-M
Stavba: Cyklostezka podél Kláštereckého potoka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	00261939
Město Klášterec nad Ohří		DIČ:	CZ00261939
Zhotovitel:		IČ:	06080090
STAVMAX Group, spol. s r.o.		DIČ:	CZ06080090
Projektant:		IČ:	28738217
MESSOR s.r.o.		DIČ:	CZ28738217
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			


Cena bez DPH			-5 498,35
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-5 498,35	-1 154,65
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-6 653,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190813/01-M

Stavba: Cyklostezka podél Kláštereckého potoka

Místo: Datum: 13. 8. 2019

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant: MESSOR s.r.o.

Zhotovitel: STAVMAX Group, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-5 498,35	-6 653,00
17060.1/re v01	Cyklostezka úsek A + B po křižovatku v ulici Příčná	72 680,37	87 943,25
17060.1.1/r ev01	Objekty PK - uznatelné náklady	72 680,37	87 943,25
17060.1.1/ NZ 2	Objekty PK uznatelné náklady NZ02 opěrka nad potokem, poval,těleso příčná AB	72 680,37	87 943,25
17060- 2/rev01	Cyklostezka úsek C+ D včetně přejezdu v ulici Příčná	-78 178,72	-94 596,25
17060.2.1/r ev01	Objekty PK - uznatelné náklady	-78 178,72	-94 596,25
17060.2.1/N Z02	Objekty PK - uznatelné náklady NZ2 asfaltový beton odečet, nájezd ul.Dlouhá CD	-78 178,72	-94 596,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka podél Kláštereckého potoka

Objekt:

17060.1/rev01 - Cyklostezka úsek A + B po křižovatku v ulici Příčná

Soupis:

17060.1.1/rev01 - Objekty PK - uznatelné náklady

Úroveň 3:

170060.1.1/NZ 2 - Objekty PK uznatelné náklady NZ02 opěrka nad
potokem, poval.těleso příčná AB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 8. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

IČ:

06080090

DIČ:

CZ06080090

Projektant:

MESSOR s.r.o.

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Zpracovatel:

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH		72 680,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	72 680,37	21,00%	15 262,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		87 943,25	
		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka podél Kláštereckého potoka

Objekt:

17060.1/rev01 - Cyklostezka úsek A + B po křižovatku v ulici Příčná

Soupis:

17060.1.1/rev01 - Objekty PK - uznatelné náklady

Úroveň 3:

170060.1.1/NZ 2 - Objekty PK uznatelné náklady NZ02 opěrka nad potokem, poval.těleso příčná AB

Místo:

Datum:

13. 8. 2019

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

Zpracovatel:


MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 680,37

HSV - Práce a dodávky HSV

72 680,37

1 - Zemní práce

38 897,51

5 - Komunikace pozemní

20 643,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 288,00

997 - Přesun sutě

-2 148,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka podél Kláštereckého potoka

Objekt:

17060.1/rev01 - Cyklostezka úsek A + B po křižovatku v ulici Příčná

Soupis:

17060.1.1/rev01 - Objekty PK - uznatelné náklady

Úroveň 3:

170060.1.1/NZ 2 - Objekty PK uznatelné náklady NZ02 opěrka nad potokem, poval, těleso příčná AB

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

Datum:

13. 8. 2019

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 680,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

72 680,37

D 1

Zemní práce

38 897,51

19	K	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm	kus	1,000	1 973,42	1 973,42
21	K	112151016	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 700 mm	kus	2,000	4 600,00	9 200,00
20	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	4 492,28	8 984,56
22	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	6 320,00	6 320,00
14	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	28,125	87,33	2 456,16

VV pro chodník křižovatka pod stadionem / u potoka

VV 187,5*0,15

VV

Součet

28,125

28,125

15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,125	131,72	3 704,63
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	196,875	10,52	2 071,13

VV 28,125*7 "Přepočtené koeficientem množství" 196,875

7	K	171102104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS dálnic	m3	28,125	75,38	2 120,06
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,125	10,77	302,91
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	50,625	181,50	9 188,44

VV 28,125*1,8

50,625

9	K	182103812	Zpevnění svahu plůtky křížově ve vzdálenosti 1 m a výšce pleteniny do 300 mm ve svahu do 1:2	m2	-12,000	167,14	-2 005,68
10	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	m2	-48,000	173,36	-8 321,28
11	M	69311314	textilie jutařská 100 g/m2	m2	-48,000	7,91	-379,68
12	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	36,000	91,19	3 282,84

VV nájezd na ulici Příčná

VV 1,2*15*2

36,000

D 5

Komunikace pozemní

20 643,75

13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	187,500	110,10	20 643,75
VV			60*2,5+15*2,5		187,500		
VV			konstrukce chodníku pod střediskem směr kralovehradecká a u přechodu v ul. u potoka				
VV			Součet		187,500		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 288,00

6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,400	3 030,00	25 452,00
1	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	-8,400	1 210,00	-10 164,00

D 997

Přesun sutě

-2 148,89

2	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	-4,200	19,34	-81,23
3	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	-67,200	4,83	-324,58
VV			-4,2*16 "Přepočtené koeficientem množství"		-67,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-4,200	112,52	-472,58
5	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-4,200	302,50	-1 270,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka podél Kláštereckého potoka

Objekt:

17060-2/rev01 - Cyklostezka úsek C+ D včetně přejezdu v ulici Příčná

Soupis:

17060.2.1/rev01 - Objekty PK - uznatelné náklady

Úroveň 3:

17060.2.1/NZ02 - Objekty PK - uznatelné náklady NZ2 asfaltový beton
odečet, nájezd ul.Dlouhá CD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:



CC-CZ:

Datum:

13. 8. 2019

IČ:

00261939

DIČ:

CZ00261939

IČ:

06080090

DIČ:

CZ06080090

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

-78 178,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-78 178,72	21,00%	-16 417,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-94 596,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka podél Kláštereckého potoka

Objekt:

17060-2/rev01 - Cyklostezka úsek C+ D včetně přejezdu v ulici Příčná

Soupis:

17060.2.1/rev01 - Objekty PK - uznatelné náklady

Úroveň 3:

**17060.2.1/NZ02 - Objekty PK - uznatelné náklady NZ2 asfaltový beton
odečet, nájezd ul.Dlouhá CD**

Místo:

Datum: 13. 8. 2019

Zadavatel:

Město Kláštec nad Ohří

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-78 178,72

5 - Komunikace pozemní

-86 373,00

998 - Přesun hmot

-1 423,77

HSV - Práce a dodávky HSV

9 618,05

1 - Zemní práce

9 618,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka podél Kláštereckého potoka

Objekt:

17060-2/rev01 - Cyklostezka úsek C+ D včetně přejezdu v ulici Příčná

Soupis:

17060.2.1/rev01 - Objekty PK - uznatelné náklady

Úroveň 3:

17060.2.1/NZ02 - Objekty PK - uznatelné náklady NZ2 asfaltový beton
odečet, nájezd ul.Dlouhá CD

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

Datum:

13. 8. 2019

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:


MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-78 178,72

D		5	Komunikace pozemní				-86 373,00
1	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-135,000	303,89	-41 025,15
2	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-135,000	335,91	-45 347,85

D		998	Přesun hmot				-1 423,77
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	-38,869	36,63	-1 423,77

D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 618,05
---	--	-----	---------------------	--	--	--	----------

D		1	Zemní práce				9 618,05
5	M	58331201	Štěrkopísek netříděný	t	49,680	193,60	9 618,05
VV		nájezd na ulici Dlouhá hutněný násyp _ prodloužení na 8,33					
VV		80*0,3*1,8*1,15			49,680		
VV		Součet			49,680		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změny č: 3

Datum změny: 20.8. 2020

Název veřejné zakázky:

„Cyklostezka podél Kláštereckého potoka v Klášterci nad Ohří“

Zhotovitel: STAVMAX Group, s.r.o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny:	Druh financování:	Druh prací:	Stavební oddíly:
-Úprava čas. harmonogramu -Změna provedení zemních prací	Dotace	Vícepráce Méněpráce	1 – Zemní práce 5 – Pozemní komunikace 9 - Ostatní konstr. a bourání

Popis změn:

1. Změna termínu dokončení z důvodu neplánované výměny NTL plynovodu společnosti GasNet s.r.o.

V předmětné části úseku trasy A budoucí cyklostezky se nachází rozvody NTL plynovodu. Správce a majitel plynovodu společnost GasNet s.r.o. v rámci rozvoje své distribuční sítě plánuje mimo jiné přechod v daném úseku z NTL na STL, ke kterému je nezbytná výměna potrubí.

Z důvodu udržitelnosti projektu cyklostezky a podmínek poskytovatele dotace však neumožní Město výměnu provést min. po dobu 5 let od ukončení stavby. Z tohoto důvodu bylo vyvoláno jednání se zástupci společnosti GasNet s.r.o., která rozhodla, vzhledem k havarijnímu stavu potrubí, o provedení předčasné výměny potrubí tohoto úseku již v koordinaci se stavbou cyklostezky. Ve zrychleném režimu společnost GasNet s.r.o. zajistila dodavatele výměny potrubí. Práce na výměně plynovodu budou zahájeny 09.09.2020 a dokončení se předpokládá do 30.09.2020 (21 dní). Realizace výměny potrubí firmou GasNet s.r.o. má přímou vazbu na prodloužení doby realizace stavebních prací v tomto úseku. V době od plánu po dokončení realizace výměny potrubí nemůže dodavatel pokračovat ve stavebních pracích - položit obručnický v tomto úseku a dokončit konstrukční vrstvy komunikace trasy A, a má vazbu na další úkony dodavatele, které přímo souvisí s dokončením stavby (např. stanoviska DOSS či geometrické zaměření dokončené stavby vč. odsouhlasení příslušným katastrálním úřadem) bez, kterých dodavatel nemůže požádat odbor dopravy MěÚ Kadaň o vydání kolaudačního souhlasu.

Z tohoto důvodu žádá dodavatel v souladu s Článkem III.bodu 3.8. Smlouvy o dílo o prodloužení doby realizace na 206 dní (není započítáno přerušení prací firmy GasNet s.r.o. – 21 dní, se kterým bude realizace dokončena za 227 dní od předání staveniště).

2. Cyklostezka úsek A + B:

1.1/NZ 2 - Objekty PK uznatelné náklady NZ02 opěrka nad potokem, poval, těleso příčná AB

1- Zemní práce

Odstranění nevhodných dřevin a pařezů, zpevnění svahu

Vícepráce v hodnotě: +49.604,15 Kč bez DPH

Méněpráce v hodnotě: -10.706,64 Kč bez DPH

5- Komunikace

Konstrukce chodníku

Vícepráce v hodnotě: +20.643,75 Kč bez DPH

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání (vč. přesunů sutě a hmot)

Bourání kamenného (betonového) zdiva – zeď mostu

Vícepráce v hodnotě: +25.452,00 Kč bez DPH

Méněpráce v hodnotě: -12.312,89 Kč bez DPH

Celkem za kapitolu

1.1/NZ 2 - Objekty PK uznatelné náklady NZ02 opěrka nad potokem, poval,těleso příčná A
Vícepráce v hodnotě + 72.680,37 Kč bez DPH

3. Cyklostezka úsek C + D:

2.1/NZ02 - Objekty PK - uznatelné náklady NZ2 asfaltový beton odečet, nájezd ul.Dlouhá CD

1- Zemní práce

Hutněný násyp

Vícepráce v hodnotě: + 9.618,05 Kč bez DPH

2- Komunikace

Asfaltový beton

Méněpráce v hodnotě: - 87.796,77 Kč bez DPH

Celkem za kapitolu

2.1/NZ02 - Objekty PK - uznatelné náklady NZ2 asfaltový beton odečet, nájezd ul.Dlouhá CD

Méněpráce v hodnotě -78.178,72 Kč bez DPH

Zdůvodnění změn:

1. Cyklostezka úsek A + B

V trase cyklostezky se nachází 3 vzrostlé stromy, které je nutné pokácet (nad rámec PD a VV) – vícepráce. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že není nutné provést zpevnění svahu plůtky a jutovou rohoží – méněpráce.

Původní dlažba v chodníku, která se má pouze přeložit byla nestandardně položena bez štěrkového lože – vícepráce. Ve ZL č.2 byla zařazena položka bourání kamenného zdiva – odečtena ve ZL č.3 – méněpráce. Při bouracích prací se zjistilo, že se jedná o bourání betonového zdiva – vícepráce.

2. Cyklostezka úsek C + D:

Ve ZL č.2 byly chybně připočteny výměry 2 x 135m2 pokládka asfaltových betonů. Při realizaci bylo zjištěno, že výpočty uvedené ve VV byly správné – méněpráce. Hutněný násyp z ul. Dlouhá musel být v prodloužen nad rámec PD, dodržení max. podélného sklonu 8,33% - vícepráce

Celková bilance změn:

Vícepráce v hodnotě: +105.317,95 Kč bez DPH +127.434,72 Kč vč. DPH

Méněpráce v hodnotě: -110.816,30 Kč bez DPH -134.087,72 Kč vč. DPH



Celkem : -5.498,35 Kč bez DPH

Celkem : -6.653,00 Kč vč. DPH

Změny jsou podřazeny pod § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Posouzení změny - technický dozor: Se změnami souhlasím: 				Datum: 28.08.2020	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO: - rozpočet		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano	Termín dokončení do:	30.10. 2020	

Dopady:	Do ceny:	Snížení ceny o: (Kč vč. DPH)	-134.087,72 Kč	Bilance: -6.653,00 Kč vč. DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč vč. DPH)	+127434,72 Kč	
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně			13.563.953,98 Kč bez DPH 2.848.430,34 Kč 21% DPH 16.412.384,32 Kč vč. DPH

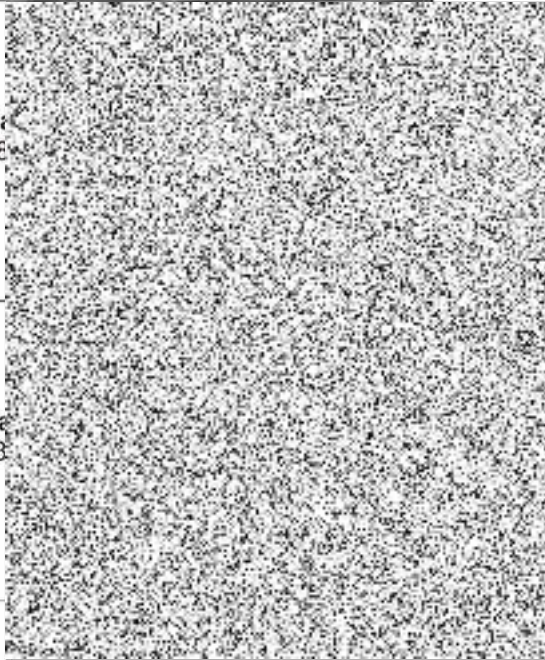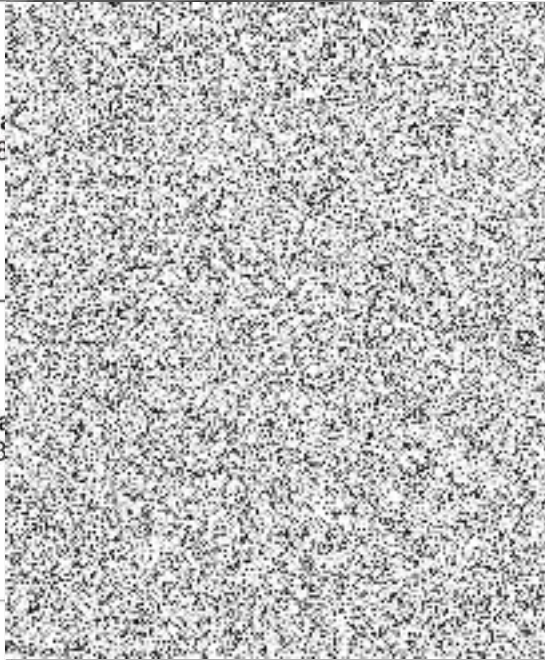Zástupce zhotovitele - jméno:	Jiří Bezděk	Datum: 28. 
		
Zástupce objednatele - jméno:	Vlastimil Dokoupil	Datum: 28. 
	Petr Vaněk	

Podrobný harmonogram výstavby

Stavba: Cyklostazie podlé Kiližterického potoka, Kiližterice nad Ohří

Struktura výhledu prací a uvozních kritické cesty										Celkový harmonogram				
P.č.	Popis činnosti	Začátek (den)	Konec (den)	Trvání (den)	Pláňová délka (m)	Reserva (den)	Kritická cesta/měsíční	Předpokl. (den)	Měsíční	1	2	3	4	5
Cena										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				
Měsíční										Celkový harmonogram				
Den										Celkový harmonogram				

1. Detenzní pŕijevajících prvd - vyřadování zařazů stavovských, vyřčení 12. až - 7. den od zahájení
2. Detenzní detenzní podběhových vřstů část A-D - 70. den od zahájení
3. Detenzní detenzní podběhových vřstů část C-D - 122. den od zahájení
4. Detenzní opřaz zů v řřsln E - 162. den od zahájení

L. Douglas Hudson/

1. Průběžná ÚPG - Kabelet - Zhodba funkčnosti el. zařízení vč. revíze - 15.9.2020
2. Všeobecné ověření - Zhodba funkčnosti el. zařízení vč. revíze - 30.9.2020

Postup realizace zakázky je definován vlivá zřizovatel/jm harmonogramem prací.
