



**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SD/452/2020/OVR**

**„Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská
v Klášterci nad Ohří“**

Město Klášterec nad Ohří

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

zastoupena: Ing. Štefanem Drozdem, starostou

IČO: 00261939

DIČ: CZ00261939

PLÁTCE DPH: ANO

ID datové schránky: 6dqbymc

zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil, tel.: [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Společnost „TDI pro RD Ciboušovská v Klášterci nad Ohří“

PETROM STAVBY, a. s. (správce společnosti)

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

PLÁTCE DPH: ANO

se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Petr Kasper, předseda představenstva, [REDACTED]

[REDACTED]

zástupce ve věcech technických: Ing. Radek Jára, technický ředitel, [REDACTED]

[REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

Silnice Topolany a. s. (společník)

IČO: 05758734

DIČ: CZ05758734

PLÁTCE DPH: ANO

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

[REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Marek Volák, předseda představenstva, [REDACTED]

[REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)





uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Preamble

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 23.10.2020 (dále jen „smlouva“), kdy jeho předmětem je úprava ceny za dílo z důvodu vzniklých vícenákladů respektive méněprací zjištěných v průběhu realizace a to snížením ceny o 50 049,66 Kč bez DPH tedy o 60 560,09 Kč vč. DPH – viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1Změnový list.

I.

- 1.1. Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„ 5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
a. Cena bez DPH 21 395 672,64 Kč (slovy: dvacet jeden milion tři sta devadesát pět tisíc šest set sedmdesát dvě koruny české šedesát čtyři haléřů)
b. DPH 21% ve výši 4 493 091,25 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta devadesát tři tisíc devadesát jedna korun českých dvacet pět haléřů)
c. Cena včetně DPH ve výši 25 888 763,89 Kč (slovy: dvacet pět milionů osm set osmdesát osm tisíc sedm set šedesát tři korun českých osmdesát devět haléřů)
(dále též „**Cena za provedení díla**“).“

II.

- 2.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 2.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 
.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 2.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.






2.6. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 23.10.2020 .

Příloha č. 1: změnový list

Za objednatele: 14.06.2021

Za zhotovitele: 22-06-2021

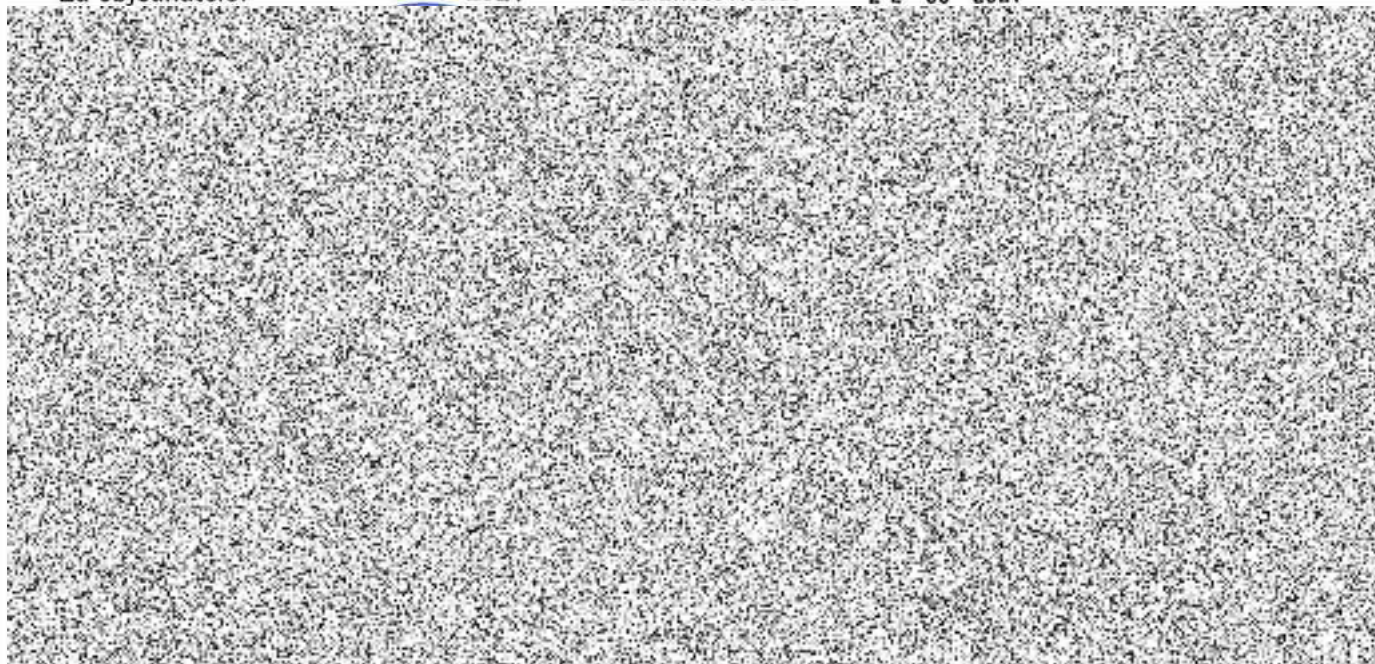

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1 - 10

Datum změny: 3.5. 2021

Název veřejné zakázky: Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Zhotovitel: Společnost pro RD Ciboušovská v Klášterci nad Ohří
Správce společnosti: Petrom stavby, a.s.
Společník: Silnice Topolany, a.s., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny:	Druh financování:	Druh prací:	Stavební oddíly:
ruční odkop sítí sondy- plyn kanalizace voda VRN	vlastní	Méněpráce Vícepráce	Zemní práce Trubní vedení Zakládání Vodorovné konstrukce Ostatní konstrukce a práce VRN

Popis změn:

1. Ruční odkopání pařezů

Oddíl 1 – Zemní práce:

- Vícepráce v hodnotě: 37 779,60 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 16 680,00 Kč bez DPH

2. Sondy - VTL plyn

Oddíl 1 – Zemní práce:

- Vícepráce v hodnotě: 6 222,60 Kč bez DPH Méněpráce v hodnotě 0 Kč bez DPH

3. SO 501, SO502, SO502a – Kanalizace

SO 501 – dešťová kanalizace

Oddíl 8 - Trubní vedení

Vícepráce v hodnotě: 19 866,00 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 41 426,00 Kč bez DPH

SO 502 – splašková kanalizace

Vícepráce v hodnotě: 25 542,00 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 53 262,00 Kč bez DPH

SO502a přípojky splaškové kanalizace

Vícepráce v hodnotě: 101 040,74 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 108 418,85 Kč bez DPH

4. SO 501, SO502 – náhrada pískového lože

Oddíl 2 – zakládání

Vícepráce v hodnotě: 9 648,00 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 129 696,80 Kč bez DPH

Oddíl 4-vodorovné konstrukce

Vícepráce v hodnotě: 31 800,00 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 25 800,00 Kč bez DPH

5. SO 502- Změna obsypu potrubí

SO 502 – splašková kanalizace

Oddíl 1 – Zemní práce:

Vícepráce v hodnotě: 32 677,38 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě - 17 055,00 Kč bez DPH

6.SO 501- Změna obsypu potrubí

SO 501 – dešťová kanalizace kanalizace

Oddíl 1 – Zemní práce:

Vícepráce v hodnotě: **44 251,55 Kč bez DPH.** Méněpráce v hodnotě – **23 095,80 Kč bez DPH**

7. SO 503a- Změna vodovodních armatur

SO 503a – vodovodní přípojky

Oddíl 8 - Trubní vedení

Vícepráce v hodnotě: **158 975,00 Kč bez DPH.** Méněpráce v hodnotě – **159 076,50 Kč bez DPH**

8. 9. SO 401- rozdělení kabelové trasy; VRN

Oddíl 9 - ostatní konstrukce a práce

Vícepráce v hodnotě: **29 041,92 Kč bez DPH.** Méněpráce v hodnotě – **0 Kč bez DPH**

SO 999 – vrn

Vícepráce v hodnotě: **23 800,00 Kč bez DPH**

10 . SO 502- sanace podloží pod betonové šachty

SO 502 – splašková kanalizace

Oddíl 1 – Zemní práce:

Vícepráce v hodnotě: **1 096,50 Kč bez DPH.** Méněpráce v hodnotě **0 Kč bez DPH**

Oddíl 4-vodorovné konstrukce

Vícepráce v hodnotě: **2 720,00 Kč bez DPH.**

Vícepráce v celkové hodnotě: 524 461,29 Kč bez DPH.

Méněpráce v celkové hodnotě – 574 510,95 Kč bez DPH.

Zdůvodnění změn:

1.změna: Ruční odkopání pařezů

Z důvodu vedení stávající kabelové trasy Cetin a Kabel 1 v bezprostřední blízkosti pařezů, které se musí dle PD odstranit, se musí stavební práce namísto strojního odstranění pařezů změnit a to na ruční odkopání.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.

2.změny: Sondy VTL plynu

Při realizaci přeložky VTL plynovodu byla v souběhu s VTL plynovodem nalezeno ve vzdálenosti cca 2m potrubí o prům. 80mm. Po domluvě s TDI a investorem byly provedeny další sondy, za účelem ověření trasy a skutečnosti zda potrubí nebude pokračovat dále do trasy nového vedení inženýrských sítí nové výstavby. Sondy byly kopány ručně po vrstvách z důvodů ochr. pásma VTL plynu. Po obnažení potrubí, bylo po odvrtní spol. GASNET zjištěno, že se jedná o starý a nefunkční plynovod, který bude následně znovu zasypán.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.

3.změna: SO 501, SO 502 , SO 502a – kanalizace

Tento návrh změny řeší záměnu přechodových desek za kónusy v objektech dešťové kanalizace SO 501 a splaškové kanalizace SO 502. Uvažovaná změna přinese finanční úsporu a to při dodržení všech kvalitativních podmínek objednatele.

V této změně se také řeší a to dle požadavku SČVK a investora přípojky splaškové kanalizace SO 502a – navržené kameninové roury se budou měnit za plastové potrubí DN 160 SN8.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 7 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. změna: SO 501, SO 502 – Náhrada pískového lože, odpočet drenáží

Na základě posouzení geotechnika se bude pískové lože – splaškové kanalizace v objektu SO 502 v problematických - lokálních místech měnit za lože z fr.8/16 s přidáním geotextilie, kterou geotechnik navrhl. Důvodem návrhu změny, je lokální výskyt pramenů spodní vody a toto opatření povede k zamezení odplavení pískového lože pod potrubím. V této změně se odpočítává drenáž, která z podúrovně splaškové kanalizace nelze nikam zaústit.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změny nezbytné pro kompletní dokončení díla.

5. změna: SO 502 – Změna obsypu potrubí (délka 69,3m) Š4-Š1,Š3-Š14

6. změna: SO 501 – Změna obsypu potrubí (délka 84m) DŠ1-DŠ3,DŠ16-DŠ2

Na základě návrhu geotechnika bude provedena změna obsypu potrubí dešťové a splaškové kanalizace v daných metrech délky ze štěrkopísku frakce 0/4 na frakci 8/16. Z důvodů neustálého přítoku spodní vody bylo geotechnikem schváleno řešení s obsypem fr8/16, protože obsypy ze štěrkopísku 0/4 jsou v takových podmínkách nevhodné a mohlo by docházet k jejich odplavení a následnému poklesu zemin v násypu zemního tělesa .

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změny nezbytné pro kompletní dokončení díla.

7. změna: SO 503a – Změna vodovodních armatur

Na základě dodatečného požadavku zástupce společnosti SVS a.s., budoucího správce vodovodu, bylo nezbytné nahradit projektem uvažované navrtávací pasy za schválené zástupcem SČVK panem Müllerem, který požaduje oproti PD pasy od výrobce HAWLE, které má ve svých stanovených standardech.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 7 a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám.

8. změna: SO 401 – Rozdělení kabelové trasy betonovými obručníky

Dle požadavků spol. ČEZ a.s., která bude ukládat kabely VN a NN ve společné kabelové rýze se bude muset použít betonový obručník jako kabelová přepážka rozdělující silové a datové kabely dle požadované normy. V rozpočtu ani PD se s rozdělovacím prvkem obruš nepočítalo. Na základě požadavku spol. ČEZ bude nutné tento rozdělovací prvek do výkopu doplnit.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změny nezbytné pro kompletní dokončení díla.

9. změna: VRN- koordinační činnost s dodavatelem IS ČEZ

Tato změna se zabývá koordinační činností a geodet. pracemi spojenými s výkopy a pokládkou kabelové trasy pro VN,NN (ČEZ). Tyto úkony zhotovitel musí provádět a zajišťuje tak součinnost a koordinaci více dodavatelů při realizaci pokládky kabelových tras pro danou lokalitu.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změny nezbytné pro kompletní dokončení díla.

Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 6 jsou splněny. Cenový nárůst pro změny dle § 222

odst. 6 ve znění dodatku č. 1 v návaznosti na § 222 odst. 9 ZZVZ v limitu 30 % není překročen.

10. změna: SO 502 – Sanace podloží pod betonové šachty

Z důvodů přítoku spodní vody při výstavbě kanalizačních šachet splaškové kanalizace objektu SO502, bude řešena sanace podloží pod šachtová dna v tl. 30cm kamenivem fr.63/125, dále bude proveden betonový základ v souladu s PD.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 6 a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změnu nezbytnou pro kompletní dokončení díla.

Posouzení změny – technický dozor investora:			Datum:	
Ing. Ota Vettermann Se změnami souhlasím.			31.5. 2021	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Doba realizace:	270 kalendářních dnů
Dopady:	Do ceny:	Snížení ceny o: Bez DPH	- 574 510,95 Kč	
		Zvýšení ceny o: Bez DPH	524 461,29 Kč	
Bilance:			- 50 049,66 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veřejné zakázky po změně bez DPH			21 395 672,64 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele:		Petr Kasper	Datum, podpis:	
				
Zástupce objednatele:		Vlastimil Dokoupil	31.5. 2021	
		Jana Kühnerová		

**Akce: Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří**

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo změny	Název	CENA
1	Ruční odkopání pařezů	21 099,60
2	Sondy - VTL plyn	6 222,60
3	SO 501, SO 502, SO 502a - kanalizace	-56 658,11
4	SO 501, SO 502 - Náhrada pískového lože, odpočet drenáží	-114 048,80
5	SO 502 - Změna obsypu potrubí (délka 69,3m) Š1 - Š4, Š3 - Š14	15 622,38
6	SO 501 - Změna obsypu potrubí (délka 84,0m) DŠ1-DŠ3, DŠ16- DŠ2	21 155,75
7	SO 503a - Změna vodovodních armatur	-101,50
8	SO 401 - Rozdělení kabelové trasy obručníky	29 041,92
9	VRN - koordinační činnost s dodavatelem IS ČEZ	23 800,00
10	SO 502 - Sanace podloží pod betonové šachty	3 816,50
	CELKEM CENA BEZ DPH	-50 049,66

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.1

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

Ruční odkopání pařezů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 099,60

DPH základní
snížená

Základ daně
21 099,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 430,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

25 530,52

SOUPIS PRACÍ - změna č.1

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

Ruční odkopání pařezů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

21 099,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 099,60

D 1

Zemní práce

21 099,60

1	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč - ruční odkopání pařezů	hod	16,000	282,00	4 512,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč - ruční odsekání kořenového systému	hod	8,000	282,00	2 256,00	CS ÚRS 2020 02
3	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč - ruční výkopové práce v blízkosti kabelového vedení	hod	16,000	282,00	4 512,00	CS ÚRS 2020 02
4	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	3,000	399,00	1 197,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	kus	4,000	1 260,00	5 040,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	983,00	2 949,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	2 600,00	10 400,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	27,10	81,30	CS ÚRS 2019 01
9	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	4,000	145,00	580,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	411,00	1 233,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	4,000	866,00	3 464,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	3,000	85,10	255,30	CS ÚRS 2019 01
13	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	4,000	325,00	1 300,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	-2,000	2 880,00	-5 760,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	-3,000	3 640,00	-10 920,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.2

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

Sondy - VTL plyn

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 222,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 222,60	21,00%	1 306,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 529,35

SOUPIS PRACÍ - změna č.2

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

Sondy - VTL plyn

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

6 222,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 222,60

D 1

Zemní práce

6 222,60

1	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč - ruční výkop sondy	hod	6,000	282,00	1 692,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	18,000	125,00	2 250,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,000	39,70	714,60	CS ÚRS 2020 02
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,000	87,00	1 566,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.3

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 501, SO502, SO 502a - kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-56 658,11

DPH základní
snižená

Základ daně
-56 658,11
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-11 898,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

-68 556,31

SOUPIS PRACÍ - změna č.3

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 501, SO502, SO 502a - kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-56 658,11

D HSV SO 501 - Dešťová kanalizace

-21 560,00

D 8 Trubní vedení

-21 560,00

45	M	BTL.0006069.URS	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	-14,000	2 959,00	-41 426,00	CS ÚRS 2019 01
51	M	BTL.0006185.URS	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	14,000	1 419,00	19 866,00	CS ÚRS 2019 01

D HSV SO 502 - Splašková kanalizace

-27 720,00

D 8 Trubní vedení

-27 720,00

50	M	BTL.0006069.URS	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	-18,000	2 959,00	-53 262,00	CS ÚRS 2019 01
51	M	BTL.0006185.URS	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	18,000	1 419,00	25 542,00	CS ÚRS 2019 01

D HSV SO 502a - Přípojky splaškové kanalizace

-7 378,11

D 8 Trubní vedení

-7 378,11

20	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	-172,500	172,00	-29 670,00	CS ÚRS 2019 01
21	M	59710651	troubka kameninová glazovaná DN 150mm L1,25m spojovací systém F	m	-175,088	396,00	-69 334,85	CS ÚRS 2019 01
22	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	-30,000	195,00	-5 850,00	CS ÚRS 2019 01
23	M	59711852	ucpávka kameninová glazovaná DN 150mm spojovací systém F	kus	-30,000	118,80	-3 564,00	CS ÚRS 2019 01
1	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	172,500	138,00	23 805,00	CS ÚRS 2020 02
2	M	28611165	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8	m	175,088	272,00	47 623,94	CS ÚRS 2020 02
3	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	30,000	221,00	6 630,00	CS ÚRS 2020 02
4	M	OSM.222830	KGUS přech. kam./PVC DN 160 SN8	kus	30,000	504,66	15 139,80	CS ÚRS 2020 02
5	K	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160	kus	30,000	221,00	6 630,00	CS ÚRS 2020 02
6	M	28611588	zátky kanalizace plastové KG DN 150	kus	30,000	40,40	1 212,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.4

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 501, SO502 - Náhrada pískového lože, odpočet drenáží

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-114 048,80

DPH základní
snižená

Základ daně
-114 048,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-23 950,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

-137 999,05

SOUPIS PRACÍ - změna č.4

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 501, SO502 - Náhrada pískového lože, odpočet drenáží

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-114 048,80

D HSV SO 502 - Splašková kanalizace

-114 048,80

D 2 Zakládání

-120 048,80

25	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-581,600	223,00	-129 696,80	CS ÚRS 2019 01
	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	300,000	18,30	5 490,00	CS ÚRS 2020 02
	M	69334310	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2	m2	330,000	12,60	4 158,00	CS ÚRS 2020 02

D 4 Vodorovné konstrukce

6 000,00

26	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-30,000	860,00	-25 800,00	CS ÚRS 2019 01
	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 8-16 mm	m3	30,000	1 060,00	31 800,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.5

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 502 - Změna obsypu potrubí (délka 69,3m), Š1-Š4, Š3-Š14

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 622,38

DPH základní
snížená

Základ daně
15 622,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 280,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

18 903,08

SOUPIS PRACÍ - změna č.5

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 502 - Změna obsypu potrubí (délka 69,3m), Š1-Š4, Š3-Š14

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 622,38

D HSV Práce HSV

15 622,38

D 1 Zemní práce

15 622,38

23	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	-68,220	250,00	-17 055,00	CS ÚRS 2019 01
	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	68,220	479,00	32 677,38	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.6

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 501 - Změna obsypu potrubí (délka 84,0m), DŠ1-DŠ3, DŠ16-DŠ2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 155,75

DPH základní
snižená

Základ daně
21 155,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 442,71
0,00

Cena s DPH

v CZK

25 598,46

SOUPIS PRACÍ - změna č.6

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 501 - Změna obsypu potrubí (délka 84,0m), DŠ1-DŠ3, DŠ16-DŠ2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 155,75

D HSV Práce HSV

21 155,75

D 1 Zemní práce

21 155,75

23	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	-92,383	250,00	-23 095,80	CS ÚRS 2019 01
23	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	92,383	479,00	44 251,55	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.7

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 503a - Změna vodovodních armatur

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-101,50

DPH základní
snížená

Základ daně

-101,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-21,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

-122,82

SOUPIS PRACÍ - změna č.7

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 503a - Změna vodovodních armatur

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-101,50

D HSV Práce a dodávky HSV

-101,50

D 8 Trubní vedení

-101,50

24	M	WVN.FF130254R1	Navrtávací T-kus bez vrtáku 80-32	kus	-31,000	693,00	-21 483,00	
28	M	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN 10/16 DN 40x140mm	kus	-31,000	4 438,50	-137 593,50	CS ÚRS 2019 01
1	M		HAWLE 5250 HAKU navrtávací pas 90/5/4	kus	25,000	1 499,00	37 475,00	
2	M		HAWLE 2800 šoupě domovní přípojky 32/5/4"	kus	25,000	4 860,00	121 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.8

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 401 - rozdělení kabelové trasy obrubníky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 041,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 041,92	21,00%	6 098,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 140,72

SOUPIS PRACÍ - změna č.8

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 401 - rozdělení kabelové trasy obručníky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 041,92	
D HSV Práce a dodávky HSV							29 041,92	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							28 800,00	
1	K	916231R01	Montáž obručníku sadového vč.dodávky obručníku 50x5x20cm	m	200,000	144,00	28 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.9

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

VRN - koordinační činnost s dodavatelem IS ČEZ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 800,00	21,00%	4 998,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 798,00

SOUPIS PRACÍ - změna č.9

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

VRN - koordináční činnost s dodavatelem IS ČEZ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 800,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				23 800,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 800,00	
1	K		Koordináční činnost	kpl.	1,000	9 000,00	9 000,00	
2	K		Geodetické práce	kpl.	1,000	14 800,00	14 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU - změna č.10

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 502 - Sanace podloží pod betonové šachty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00261939

DIČ: CZ00261939

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 816,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 816,50	21,00%	801,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 617,97

SOUPIS PRACÍ - změna č.10

Stavba:

Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v loklitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří

Objekt:

SO 502 - Sanace podloží pod betonové šachty

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 816,50

D HSV Práce HSV

3 816,50

D 1 Zemní práce

1 096,50

8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,600	5,00	3,00	CS ÚRS 2019 01
16	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2019 01
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,950	30,00	148,50	CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce

2 720,00

	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	10,000	272,00	2 720,00	CS ÚRS 2020 02
--	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------
